



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2025 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

1. Genel Bilgiler

1.1 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası

1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar

1.3 Birime İlişkin Bilgiler

1.3.1 Fiziki Yapı

1.3.2 Teşkilat Yapısı

1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

1.3.4 İnsan Kaynakları

1.3.5 Sunulan Hizmetler

1.3.5.4 Kalite Yönetim ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2. Amaç ve Hedefler

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

3. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

3.1 Mali Bilgiler

3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

3.1.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3.1.3 Mali Denetim Sonuçları

3.2 Performans Bilgileri

3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

4. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

4.1 Üstünlükler

4.2 Zayıflıklar

4.3 Değerlendirme

5. Öneri ve Tedbirler

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizin bakım, onarım, işletme, yeni projelerin hazırlanması ve gerekli olan hizmet binalarının yapılmasında sorumluluk sahibi olup, çalışmalarına Üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçlarına uygun şekilde devam etmektedir. 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Raporla ortaya çıkan veriler aynı zamanda birimimizin 2025 yılı performansının da bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan veriler doğrultusunda hem üniversitemiz hem de kamuoyu birimimizin performansını değerlendirme olanağı bulacaktır.

2025 yılı birim faaliyet raporunu oluşturan projelerin ve hizmetlerin gerçekleştirilerek Birim Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Esat ÇELİK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Misyon Vizyon ve Kalite Politikası

1.1.1 Misyonumuz

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

1.1.2 Vizyonumuz

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Ayrıca bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için zoru başarmak, imkânsızı zora dönüştürmektir.

1.1.3 Kalite Politikamız

- Stratejik planda belirtilen hedef ölçüt ve amaçların gerçekleştirilmesini,
- İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,
- Birim bazında kalite bilincinin geliştirilmesini,
- Ekip çalışmasını etkin kılarak kalite düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesini,
- Çözüm odaklı bir yönetim anlayışının benimsenmesini,
- Şeffaf katılımcı ve hesap verilebilirlik temelinde hareket edilmesini,
- Kurumsal risk yönetimi çalışmalarıyla desteklenen ve engelli bireyleri de dikkate alan sağlıklı çevreci güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturulmasını ilke edinen,
- Planla Uygula Kontrol et ve Önlem al yaklaşımını benimseyen bir birim olmak,

1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlığının görevleri

- a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak bakım ve onarım işlerini yapmak

- b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarım ile benzer işleri yürütmek şeklinde belirtilmiştir.

1.3 Birime İlişkin Bilgiler

1.3.1 Fiziki Yapı

1.3.1.1 Hizmet Alanları

Başkanlığımız Kuzyekent kampüsünde yer alan Rektörlük Binasının 3. katında 18 adet çalışma ofisi ve toplam 436,30 m² alanda hizmet vermektedir.

Tablo:1 Birim Hizmet Alanları

| Hizmet Alanları | Ofis Sayısı | Alan (m ²) | Kullanan Kişi Sayısı |
|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| İdari Personel Hizmet Alanları | 18 | 436,30 | 35 |

1.3.1.2 Ambar ve Arşiv Alanları

Tablo:2 Birim Ambar ve Arşiv Alanları

| Hizmet Alanları | Adet | Alan (m ²) |
|-----------------|----------|------------------------|
| Ambar Alanları | 3 | 123 |
| Arşiv Alanları | 1 | 74,8 |
| TOPLAM | 4 | 197,80 |

1.3.2 Teşkilat Yapısı

Başkanlığımızın teşkilat yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre

- Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü
- Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
- İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Daire Başkanı

Yapım ve Etüt Proje Şube
Müdürlüğü

Bakım Onarım
Şube
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Kontrollük
Birimi

Etüt Proje
Birimi

Bakım Onarım
Birimi

İhale Birimi

Plan Bütçe ve
Raporlama
Birimi

Personel Maaş
ve Özlük İşleri
Birimi

Sekreteryaya ve
Arşiv Hizmetleri
Birimi

Taşınır Kayıt
Birimi

1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Başkanlığımız teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına ihtiyaç duyduğu teknolojik ve bilişim altyapısını önemli ölçüde tamamlamıştır. Üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemi ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden faydalanmasının yanı sıra Başkanlığımız AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Programı, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapma imkânı sağlayan AutoCAD, NetCAD, STA4CAD programlarını kullanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımızın yıllık faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporları Başkanlığımız web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

1.3.3.1 Yazılımlar

Tablo:3 Birim Yazılım Kaynak Sayıları

| Yazılım | Açıklama |
|---|---|
|  | Başkanlığımız tarafından yapılan yazışmalar ile personel özlük iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. |
|  | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden Yatırım Programı hazırlık iş ve işlemleri ile mevcut projelere ait izleme verilerinin girişi ve ödenek talep iş ve işlemleri yürütülmektedir. |
|  | İhale iş ve işlemleri Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülmektedir. |
|  | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi üzerinden Başkanlığa ait bütçe iş ve işlemleri yürütülmektedir. |
|  | Başkanlık tarafından yapılacak ödemelere ait iş ve işlemler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir. |
|  | Personele ait maaş iş ve işlemleri ile Taşınır iş ve işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir. |
|  | Personele ait sigorta, işe giriş ve işten ayrılış iş ve işlemleri ile yüklenici firmalara ait borç sorgulama iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. |
|  | T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İl Yatırım Takip Sistemi üçer aylık dönemler halinde yatırım projelerine ait veri giriş iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. |
|  | Üniversitemiz tapu iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne ait olan otomasyondur. |

1.3.3.2 Bilgisayar ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo:4 Birim Bilgisayar ve Teknolojik Kaynak Sayıları

| | İdari | Eğitim Amaçlı | Toplam |
|---------------------|-------|---------------|--------|
| Masaüstü Bilgisayar | 36 | 0 | 36 |
| Dizüstü Bilgisayar | 3 | 0 | 3 |
| Bilgisayar Ekranı | 36 | 0 | 36 |
| Projeksiyon | 2 | 0 | 2 |
| Fotokopi Makinesi | 2 | 0 | 2 |
| Faks | 0 | 0 | 0 |
| Fotoğraf Makinesi | 2 | 0 | 2 |
| Yazıcı | 32 | 0 | 32 |
| Tarayıcı | 3 | 0 | 3 |


1.3.4 İnsan Kaynakları

Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Mimar, 9 Mühendis, 12 Tekniker, 10 Teknisyen, 8 Sürekli İşçi, 4 Hizmetli ve 1 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 50 personel **fili** olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız kadrosunda bulunan 1 Mühendis, 9 Tekniker, 5 Teknisyen ve 1 Sözleşmeli Personel 13-b/4 ile farklı birimlere görevlendirilmiştir. Farklı birimlerde görev yapan 8 Sürekli İşçi ile 1 Sözleşmeli Personel 13-b/4 ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.

Tablo:5 Başkanlığımız Personelinin Dağılımı

| BAŞKANLIĞIMIZ PERSONEL DAĞILIMI | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| UNVANI | KADROSU BAŞKANLIĞIMIZDA OLAN PERSONEL | 13-B/4 İLE FARKLI BİRİME GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL | 13-B/4 İLE BAŞKANLIĞIMIZA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL | FİİLİ OLARAK BAŞKANLIĞIMIZDA GÖREV YAPAN PERSONEL |
| DAİRE BAŞKANI | 1 | — | — | 1 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | 1 | — | — | 1 |
| ŞEF | 2 | — | — | 2 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | — | — | 1 |
| MİMAR | 1 | — | — | 1 |
| MÜHENDİS | 10 | 1 | — | 9 |
| TEKNİKER | 21 | 9 | — | 12 |
| TEKNİSYEN | 15 | 5 | — | 10 |
| HİZMETLİ | 4 | — | — | 4 |
| SÜREKLİ İŞÇİ | — | — | 8 | 8 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 57 | 16 | 10 | 50 |

FİİLİ OLARAK GÖREV YAPAN PERSONEL DAĞILIMI




- DAİRE BAŞKANI
- ŞUBE MÜDÜRÜ
- ŞEF
- BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
- MİMAR
- MÜHENDİS
- TEKNİKER
- TEKNİSYEN
- HİZMETLİ
- SÜREKLİ İŞÇİ
- SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1.3.4.3 İdari Personel


Tablo:6 İdari Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı

| Hizmet Sınıfı | Dolu | Boş | Toplam |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Genel İdare Hizmetleri | 5 | 11 | 16 |
| Teknik Hizmetler | 48 | 29 | 77 |
| Yardımcı Hizmetler | 4 | 1 | 5 |
| TOPLAM | 57 | 41 | 97 |




Tablo:7 İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| | Ortaöğretim | Önlisans | Lisans | Lisansüstü |
|-------------|-------------|----------|--------|------------|
| Kişi Sayısı | 4 | 17 | 28 | 7 |
| Yüzde | 7% | 30% | 50% | 13% |




Tablo:8 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

| | 1-3 Yıl | 4-6 Yıl | 7-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16-20 Yıl | 21-Üzeri |
|-------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| Kişi Sayısı | 7 | — | 2 | 20 | 14 | 13 |
| Yüzde | 13% | 0% | 4% | 36% | 25% | 23% |




Tablo:9 İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı

| | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51-Üzeri |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kişi Sayısı | 1 | 8 | 5 | 12 | 21 | 9 |
| Yüzde | 2% | 14% | 9% | 21% | 38% | 16% |



Tablo:10 İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

| | Kadın | Erkek |
|-------------|-------|-------|
| Kişi Sayısı | 6 | 50 |
| Yüzde | 11% | 89% |



1.3.4.4 Sözleşmeli Personel

Başkanlığımız kadrosunda 1 Sözleşmeli Personel bulunmakta olup, bu personel 2547 sayılı Kanununun 13-b/4 maddesi ile farklı birime görevlendirilmiştir.

Tablo:11 Sözleşmeli Personelin Niteliklerine Göre Dağılımı

| SÖZLEŞMELİ PERSONELİN | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-----|----------|
| UNVANI | EĞİTİM DURUMU | HİZMET YILI | YAŞ | CİNSİYET |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 2 | 31 | Erkek |

1.3.4.5 İşçi

Başkanlığımız kadrosunda İşçi statüsünde personel bulunmamakta olup, 8 adet personel 2547 sayılı kanunun 13-b/4 maddesi ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.

1.3.5 Sunulan Hizmetler

- Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak,
- İhale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
- İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,
- Binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek, (Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Telefon)
- Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek Kampus yerleşim planına göre uygulamalarının yapılmasında gerekli kontrollükleri yapmak,
- Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek,
- Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım teklifini ve bütçesini hazırlamak,
- Başkanlığımızda görevli ve kadrolu tüm personelimizin özlük hakları ve mali ödemelerini gerçekleştirmek,
- Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneğinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak,

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerde (Mal ve Malzeme Alımı, Bakım-Onarım Yapıtırılması ve Hizmet Alımı) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre doğrudan alım yöntemiyle yapılarak zamanın ve ödeneğin ekonomik kullanılmasına dikkat edilmiştir.

1.3.5.4 Kalite Yönetim ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

- ✓ 21.01.2025 tarihinde Birim Kalite Toplantısı düzenlenerek Birim İç Değerlendirme Raporunun son haline karar verildi.

- ✓ 21.02.2025 tarihli Birim Kalite Toplantısı düzenlenerek Kalite Faaliyet Planı kararlaştırıldı.
- ✓ 19.03.2025 tarihinde Birim personeline yönelik Kalite Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
- ✓ 21.05.2025 tarihinde Başkanlığımızda gerçekleştirilen İç Tetkik neticesinde hazırlanan rapora göre herhangi bir düzeltme formunun yazılmasına gerek görülmemiştir.
- ✓ 24.04.2025 tarihinde iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla 2025 yılı 1. dönem Danışma Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik.
- ✓ 15-17.09.2024 tarihleri arasında Başkanlığımıza dair Memnuniyet Anketi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 18-21.11.2025 tarihleri arasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi düzenlenmiştir.
- ✓ 02.12.2025 tarihinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile İç Paydaş Toplantısı düzenlenmiştir.
- ✓ 16.12.2025 tarihinde iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla 2025 yılı 2. dönem Danışma Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik.
- ✓ 16-18.12.2025 tarihleri arasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Danışma Kurulu üyelerine anket düzenlenmiştir.
- ✓ 23.12.2025 tarihinde Birim Kalite Toplantısı düzenlenerek, birim personeline kalite kapsamında bilgilendirmeler yapılmıştır.
- ✓ 25-26.12.2025 tarihleri arasında Birim Kalite Toplantısına katılan birim personele yönelik kalite anketi uygulanmıştır.
- ✓ 2024 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak internet sayfasında yayınlandı.

1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversite idari teşkilatı içerisinde kurulmuş olup, hiyerarşik olarak Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimin üst yöneticisi Daire Başkanıdır. Daire Başkanlığımız Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Birimin Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Daire Başkanıdır. Birimi ilgilendiren kararlar ilgili Şube Müdürlüğünün önerisi ve Daire Başkanının onayı ile alınmaktadır. Üniversiteyi ilgilendiren kararlar ise üst yönetimin onayı ile alınmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen bakım onarım talepleri işin aciliyeti, önem derecesi ve mevcut bütçe imkanları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonrasında karşılanmaya çalışılmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen yapım talepleri ise (bina, tesis vb) üst yönetimin onaylamasının ardından yatırım programında teklif edilmekte, yatırım programına alınması ve ihtiyaç duyulan ödeneğin Başkanlığımıza tahsis edilmesinin ardından da ihale ve yapım ile ilgili süreç başlatılmaktadır.

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan iç kontrol sisteminin kontrol süreçlerini titizlikle yürütmektedir. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile ihalesi yapılan gerek yıllara sari işler gerekse mali yılı içinde ödenek tahsis edilen projelerin kontrollük işleri görevlendirilen teknik personel tarafından yapılmaktadır.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1 Temel Politikalar ve Öncelikler

- ✓ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- ✓ Kastamonu Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Planı
- ✓ Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
- ✓ Orta Vadeli Program,
- ✓ Orta Vadeli Mali Plan,

Yukarıda bahsedilen belgeler ışığında

- Yürürlükte olan mevzuat hükümlerine riayet eden,
- Kaynakları etkin kullanan,
- Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
- Hesap verilebilir,
- Güvenilir,
- Yenilikçi ve yaratıcı,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşmaya önem veren,
- Teknolojiden maksimum düzeyde fayda sağlayan,
- Personelin birlik, beraberlik ve takım ruhu içerisinde hareket etmesine değer veren,
- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı,
- Etik davranış ilkelerine uygun hareket eden güçlü bir yapı oluşturmak temel politika ve hedeflerimiz arasındadır.

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1 Mali Bilgiler

Başkanlığımıza 2025 yılı bütçesi ile **384.061.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte toplam ödenek miktarı **591.961.300,00 ₺**'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin **518.909.080,52 ₺**'si harcanmıştır. Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin **%88**'i kullanılmıştır. Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kampüsü Merkezi Derslik Binası için tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanamaması, Kastamonu Üniversitesi 250 Yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Proje Hazırlama ihalesinin ***İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması*** nedeniyle iptal olması sebebiyle Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin **73.052.219,48 ₺**'si harcamaya dönüştürülememiştir.

3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo:12 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

| TERTİP | KBÖ | EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | KALAN | HARCAMA ORANI |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 01-Personel Giderleri | 45.964.000,00 | 1.415.000,00 | 900.000,00 | 46.479.000,00 | 46.467.072,41 | 11.927,59 | %99,97 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 5.178.000,00 | 290.000,00 | 225.000,00 | 5.243.000,00 | 5.230.694,54 | 12.305,46 | %99,77 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.921.000,00 | 8.930.300,00 | 2.410.000,00 | 9.441.300,00 | 9.223.871,08 | 217.428,92 | %97,70 |
| 06-Sermaye Giderleri | 329.998.000,00 | 200.800.000,00 | 0,00 | 530.798.000,00 | 457.987.442,49 | 72.810.557,51 | %86,28 |
| TOPLAM | 384.061.000,00 | 211.435.300,00 | 3.535.000,00 | 591.961.300,00 | 518.909.080,52 | 73.052.219,48 | %87,66 |

Tablo:13 Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

| Faaliyet Kodu | Başlangıç Ödeneği | Toplam Ödenek | Harcama | Harcama/Toplam Ödenek Oranı (%) |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 756-Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim | 332.418.000,00 | 533.198.000,00 | 460.306.557,69 | %86,33 |
| 759-Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim | 83.000,00 | 283.000,00 | 200.000,00 | %70,67 |
| 9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi | 51.560.000,00 | 58.480.300,00 | 58.402.522,83 | %99,86 |
| TOPLAM | 384.061.000,00 | 591.961.300,00 | 518.909.080,52 | %87,66 |

3.1.2 Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Başkanlığımızın giderlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen **384.061.000,00 ₺**'lik başlangıç ödeneğimize yıl içinde **207.900.300,00 ₺**'lik eklemeye yapılmıştır. Personel Giderleri için **46.467.072,41 ₺**, Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri için **5.230.694,54 ₺**, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **9.223.871,08 ₺**, Sermaye Giderleri için **457.987.442,49 ₺** harcanmıştır. Yılsonu toplam harcamamız **518.909.080,52 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

3.1.3 Mali Denetim Sonuçları

2025 yılında yapılan denetimlerde Başkanlığımız ile ilgili herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir

3.2 Performans Bilgileri

2025 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışına ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Tablo:14 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Durumları

| Performans Göstergeleri | Gerçekleşme Durumu | | | Açıklama |
|---|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| | Gerçekleşmedi | Kısmen Gerçekleşti | Gerçekleşti | |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kampüsü Merkezi Derslik Binası Yapım İşinin sözleşmesinin imzalanarak yapımına başlanması | | | ✓ | |
| Merkez Kampüs İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| K.Ü. Doğalgaz Dönüşüm İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| K.Ü. Çevre ve Altyapı Elektrik İşlerinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Levent Semizer Spor Salonu Deprem Güçlendirme İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| K.Ü. Açık Spor Tesisleri Tadilat İşlerinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Kastamonu Üniversitesi Levent Semizer Spor Salonu Binasının Deprem Tahkikinin Yapılması ve Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşinin kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi yapım İşinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Kastamonu Üniversitesi 2024 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşinin kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| 2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Öğrenci Evi Binaları ve Bozkurt MYO Çatı Kaplaması Değişim işinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |


| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 2025 Yılı Asansör Revizyonları işinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Kapalı Manej Yapım işinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | ✓ | | Adı geçen iş 05.12.2025 tarihinde fesih edildi. |
| 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal Alım İşi ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar Muayene ve kabul İşlemlerinin tamamlanması | | | ✓ | |
| K.Ü. Yangın İhbar Santrallerinin Yapım İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| KÜ Küre MYO Binası Tadilatı İşinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı içerisinde tamamlanması | | | ✓ | |
| 2025 Yılı KÜ Merkez Kampüs Binaların Bakım Onarım işinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| 2025 Yılı KÜ İlçedeki Okulların Bakım Onarım işinin ihalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar kabulünün yapılması | | | ✓ | |
| Erişilebilirlik standartlarının sağlanması amacıyla ihaleye çıkılması ve 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması | | | ✓ | |
| Kastamonu Üniversitesi 250 Yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Proje Hazırlama Hizmet Alım İhalesine çıkılarak 2025 yılı sonuna kadar sözleşme imzalanması | ✓ | | | İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması nedeniyle ihale iptal edildi. |
| 2026 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşi ihalesinin yıl bitmeden tamamlanması | | | ✓ | |
| Birimlerden gelen bakım onarım taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanması | | | ✓ | |
| Geçmiş yıllarda Geçici Kabulü yapılan işlerin Kesin Kabullerinin yapılması | | ✓ | | Bazı işlerin Kesin kabul işlemleri tamamlanmış olup bazılarının ise devam etmektedir. |

3.1.4 Faaliyet ve Proje Bilgileri

2025 yılı yatırım programında 7 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği 329.998.000,00 ₺ olan ve yıl içinde eklenen ödeneklerle 530.798.000,00 ₺'ye ulaşan ödeneklerin 457.987.442,49 ₺'si 2025 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

Tablo:15 Proje Bazlı Ödenek/harcama Dağılımı

| PROJE ADI | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Derslik ve Merkezi Birimler | 110.500.000,00 ₺ | 136.500.000,00 ₺ | 104.909.150,93 ₺ | 77% |
| Kampüs Altyapısı | 31.000.000,00 ₺ | 34.800.000,00 ₺ | 32.857.990,36 ₺ | 94% |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 1.000.000,00 ₺ | 1.000.000,00 ₺ | 840.000,00 ₺ | 84% |
| Açık ve Kaplı Spor Tesisleri | 5.000.000,00 ₺ | 17.500.000,00 ₺ | 15.299.542,97 ₺ | 87% |
| Muhtelif İşler | 32.500.000,00 ₺ | 61.000.000,00 ₺ | 46.132.293,53 ₺ | 76% |
| Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı | 2.000,00 ₺ | 10.002.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0% |
| Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi | 149.996.000,00 ₺ | 269.996.000,00 ₺ | 257.948.464,72 ₺ | 96% |
| TOPLAM | 329.998.000,00 ₺ | 530.798.000,00 ₺ | 457.987.442,49 ₺ | 86% |

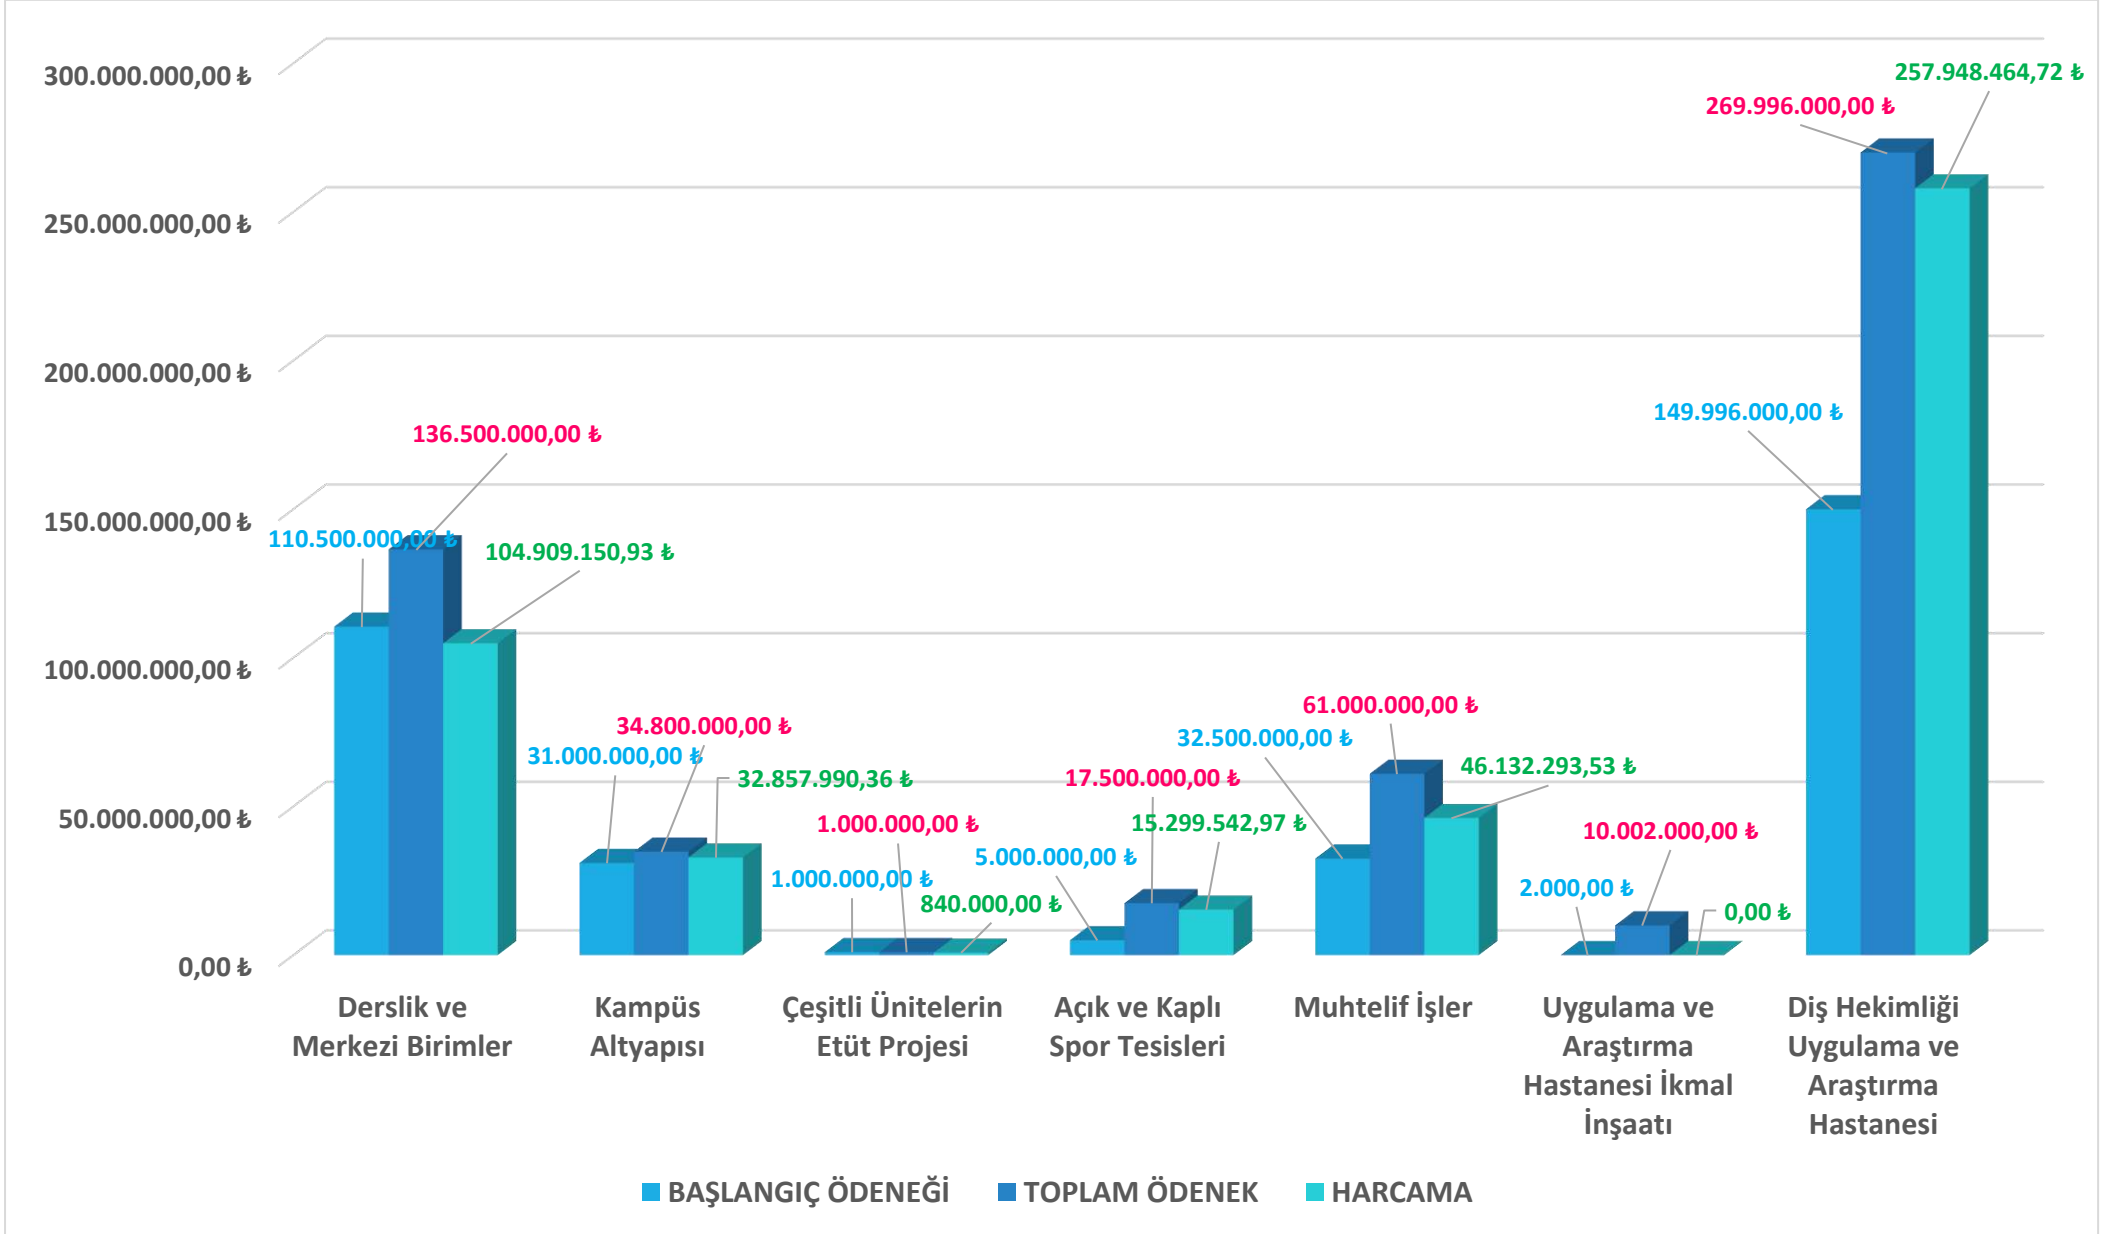

- 1. Proje Numarası** : 2008H03-935
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama – Bitiş Yılı : 2008-2026

2025 Bütçe Kanunu ile **110.500.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda **136.500.000,00 ₺**'ye düşen ödeneğin **104.909.150,93 ₺**'si harcanmıştır.

| DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| K.Ü. Eğitim ve Kültür Kampüsü Merkezi Derslik Binası Yapım İşİ | 136.500.000,00 ₺ | 104.909.150,93 ₺ | Devam ediyor |

| K.Ü. EĞİTİM VE KÜLTÜR KAMPÜSÜ MERKEZİ DERSLİK BİNASI YAPIM İŞİ | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Derslik ve Merkezi Birimler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2024/1442102 | Sözleşme Bedeli | 249.513.013.13 ₺ |
| İhale Tarihi | 27.11.2024 | İş Artış/Azalış Miktarı | — |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 15.04.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 104.909.150,93 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 24.04.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 104.909.150,93 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 700 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %35 |
| İşin Son Durumu | Devam ediyor | Yüklenici | BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. |





2. Proje Numarası : 2024H03-233409
Proje Adı : Kampüs Altyapısı
Başlama – Bitiş Yılı : 2024-2025

2025 Bütçe Kanunu ile **31.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **34.800.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **32.857.990,36 ₺**'si harcanmıştır.

| KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| Merkez Kampüs İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi | 34.800.000,00 ₺ | 13.463.338,54 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |
| K.Ü. Doğalgaz Dönüşüm İşi | | 16.008.611,58 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |
| K.Ü. Çevre ve Altyapı Elektrik İşleri | | 3.386.040,24 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |

| MERKEZ KAMPÜS İÇİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Kampüs Altyapısı | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 09.09.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/245131 | Sözleşme Bedeli | 9.494.839,50 ₺ |
| İhale Tarihi | 12.03.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 1.827.215,14 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0 00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 02.04.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 13.463.338,54 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 07.04.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 13.463.338,54 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 120/36 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici Kabulü yapıldı | Yüklenici | EREN BAKKAL |





K.Ü. DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Kampüs Altyapısı | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 22.09.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/552728 | Sözleşme Bedeli | 12.577.000,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 07.05.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 763.509,65 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 21.05.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 16.008.611,58 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 26.05.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 16.008.611,58 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 120 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici Kabulü yapıldı. | Yüklenici | YAPİTES MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ |







K.Ü. ÇEVRE VE ALTYAPI ELEKTRİK İŞLERİ

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Kampüs Altyapısı | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 26.11.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/1114894 | Sözleşme Bedeli | 2.858.058,58 ₺ |
| İhale Tarihi | 18.08.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | -36.538,38 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 02.09.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.386.040,24 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 08.09.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.386.040,24 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 80 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici Kabulü yapıldı | Yüklenici | 58 AKIN AVAN YAPI İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ |







3. Proje Numarası : 2025H03-258340
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama – Bitiş Yılı : 2025-2025

2025 Bütçe Kanunu ile **1.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, bu ödeneğin **840.000,00 ₺**'si harcanmıştır.

| ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| Kastamonu Üniversitesi Levent Semizer Spor Salonu Binasının Deprem Tahkikinin Yapılması ve Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi | 1.000.000,00 ₺ | 840.000,00 ₺ | Kabulü yapıldı |

| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LEVENT SEMİZER SPOR SALONU BİNASININ DEPREM TAHKİKİNİN YAPILMASI VE GEREKMESİ HALİNDE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ | | | |
|---|--|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 24.01.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2024/1206303 | Sözleşme Bedeli | 700.000,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 21.10.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | — |
| İhale Türü | <i>Hizmet - Pazarlık (MD 21 F)</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 11.11.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 840.000,00 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 15.11.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 840.000,00 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 45 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Kabulü yapıldı | Yüklenici | METFEN MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |

- 4. Proje Numarası** : 2023H05-212943
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama – Bitiş Yılı : 2023-2025

2025 Bütçe Kanunu ile **5.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda **17.500.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **15.299.542,97 ₺**'si harcanmıştır.

| AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| Levent Semizer Spor Salonu Deprem Güçlendirme İşi | 17.500.000,00 ₺ | 10.502.295,10 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |
| K.Ü. Açık Spor Tesisleri Tadilat İşleri | | 4.797.247,87 ₺ | Geçici Kabul aşamasında |

| LEVENT SEMİZER SPOR SALONU DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 05.08.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/406075 | Sözleşme Bedeli | 7.794.229,78 ₺ |
| İhale Tarihi | 10.04.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 1.086.547,24 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 25.04.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 10.502.295,10 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 29.04.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 10.502.295,10 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 100/8 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici kabulü yapıldı | Yüklenici | YALNIZ İNŞAAT ZEKİ YALNIZ |









K.Ü. AÇIK SPOR TESİSLERİ TADİLAT İŞLERİ

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2025/1122614 | Sözleşme Bedeli | 4.188.013,40 ₺ |
| İhale Tarihi | 19.08.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 643.800,12 ₺ |
| İhale Türü | <i>Yapım-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 9.09.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 4.797.247,87 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 15.09.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 4.797.247,87 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 60/10 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %98 |
| İşin Son Durumu | <i>Geçici kabul aşamasında</i> | Yüklenici | MN YILDIZ GRUP ENERJİ İNŞAAT GIDA VE İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |







5. Proje Numarası : 2025H03-258335
Proje Adı : Muhtelif İşler
Başlama - Bitiş Yılı : 2025-2025

2025 Bütçe Kanunu ile **32.500.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda **61.000.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **46.132.293,52 ₺**'si harcanmıştır.

| MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| Kastamonu Üniversitesi 2024 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşi | 61.000.000,00 ₺ | 483.063,82 ₺ | Kabulü yapıldı |
| 2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşi | | 944.380,63 ₺ | Geçici kabul aşamasında |
| Öğrenci Evi Binaları ve Bozkurt MYO Çatı Kaplama Değişim | | 3.821.177,76 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |
| 2025 Yılı Asansör Revizyonları | | 4.370.841,86 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |
| Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Kapalı Manej Yapım işi | | 5.903.902,36 ₺ | Fesih edildi |
| 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal Alım İşİ | | 9.843.139,20 | Kabulü yapıldı |
| K.Ü. Yangın İhbar Santrallerinin Yapımı | | 3.313.782,38 ₺ | Geçici kabul aşamasında |
| KÜ Küre MYO Binası Tadilatı | | 838.236,12 ₺ | Geçici kabulü yapıldı |

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| 2025 Yılı KÜ Merkez Kampüs Binaların Bakım Onarım | | 2.212.390,76 ₺ | Geçici kabul aşamasında |
| 2025 Yılı KÜ İlçedeki Okulların Bakım Onarım | | 4.107.644,12 ₺ | Geçici kabul aşamasında |
| Erişilebilirlik | | 6.136.468,00 ₺ | Geçici kabul aşamasında |

2025 YILI ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Muhtelif İşler</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2025/24112 | Sözleşme Bedeli | 708.200,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 28.01.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 101.676,26 ₺ |
| İhale Türü | <i>Hizmet Alımı-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 13.02.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 944.380,63 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 13.02.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 944.380,63 ₺ |
| Süre/Ek Süre | — | Fiziki Gerçekleşme Oranı | 98% |
| İşin Son Durumu | <i>Geçici kabul aşamasında</i> | Yüklenici | İSTİKLAL ASANSÖR İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |

| ÖĞRENCİ EVİ BİNALARI VE BOZKURT MYO ÇATI KAPLAMASI DEĞİŞİM | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Muhtelif İşler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 28.05.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/186790 | Sözleşme Bedeli | 2.767.308,10 ₺ |
| İhale Tarihi | 28.02.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 417.583,10 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 20.03.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.821.177,76 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 24.03.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.821.177,76 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 60/10 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici kabulü yapıldı | Yüklenici | BK MÜHENDİSLİK İNŞAAT BURAK KARTAL |



2025 YILI ASANSÖR REVİZYONLARI

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Muhtelif İşler</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 09.06.2025 |
| İhale Kayıt No: | <i>2025/243808</i> | Sözleşme Bedeli | 3.590.000,00 ₺ |
| İhale Tarihi | <i>18.03.2025</i> | İş Artış/Azalış Miktarı | 52.368,22 ₺ |
| İhale Türü | <i>Hizmet Alımı-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | <i>14.04.2025</i> | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 4.370.841,86 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | <i>19.04.2025</i> | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 4.370.841,86 ₺ |
| Süre/Ek Süre | <i>61 Takvim Günü</i> | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | <i>Kabulü yapıldı</i> | Yüklenici | İSTİKLAL ASANSÖR İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |

| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO KAPALI MANEJ YAPIM İŞİ | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Muhtelif İşler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2025/412727 | Sözleşme Bedeli | 7.764.122,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 15.04.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 1.552.788,41 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 07.05.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 5.903.902,36 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 09.05.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 5.903.902,36 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 120/30 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %60 |
| İşin Son Durumu | 05.12.2025 tarihinde Fesih edildi | Yüklenici | SEFA KAPAKLI |




| 2025 YILI BAKIM ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL ALIM İŞİ | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Muhtelif İşler</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2025/619023 | Sözleşme Bedeli | 8.202.616,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 23.05.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | — |
| İhale Türü | <i>Mal Alımı-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 17-18-19-20.06.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 9.843.139,20 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | — | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 9.843.139,20 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 90 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | <i>Kabulü yapıldı</i> | Yüklenici | <ul style="list-style-type: none"> • ERTÜRK AYDINLATMA ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ • MERİDYEN TESİSAT YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ • İPEK HIRDAVAT DEMİR ÇELİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTET ŞİRKETİ • ÖNDER NERGİZOĞLU • APE ELEKTRİK MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ |

K.Ü. YANGIN İHBAR SANTRALLERİNİN YAPIMI

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Muhtelif İşler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 19.12.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/1198298 | Sözleşme Bedeli | 2.947.227,08 ₺ |
| İhale Tarihi | 26.08.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | -185.589,68 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 15.09.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.313.782,38 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 15.09.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 3.313.782,38 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 100 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | |
| İşin Son Durumu | Geçici kabul aşamasında | Yüklenici | İSMAİL YÜKSEL |



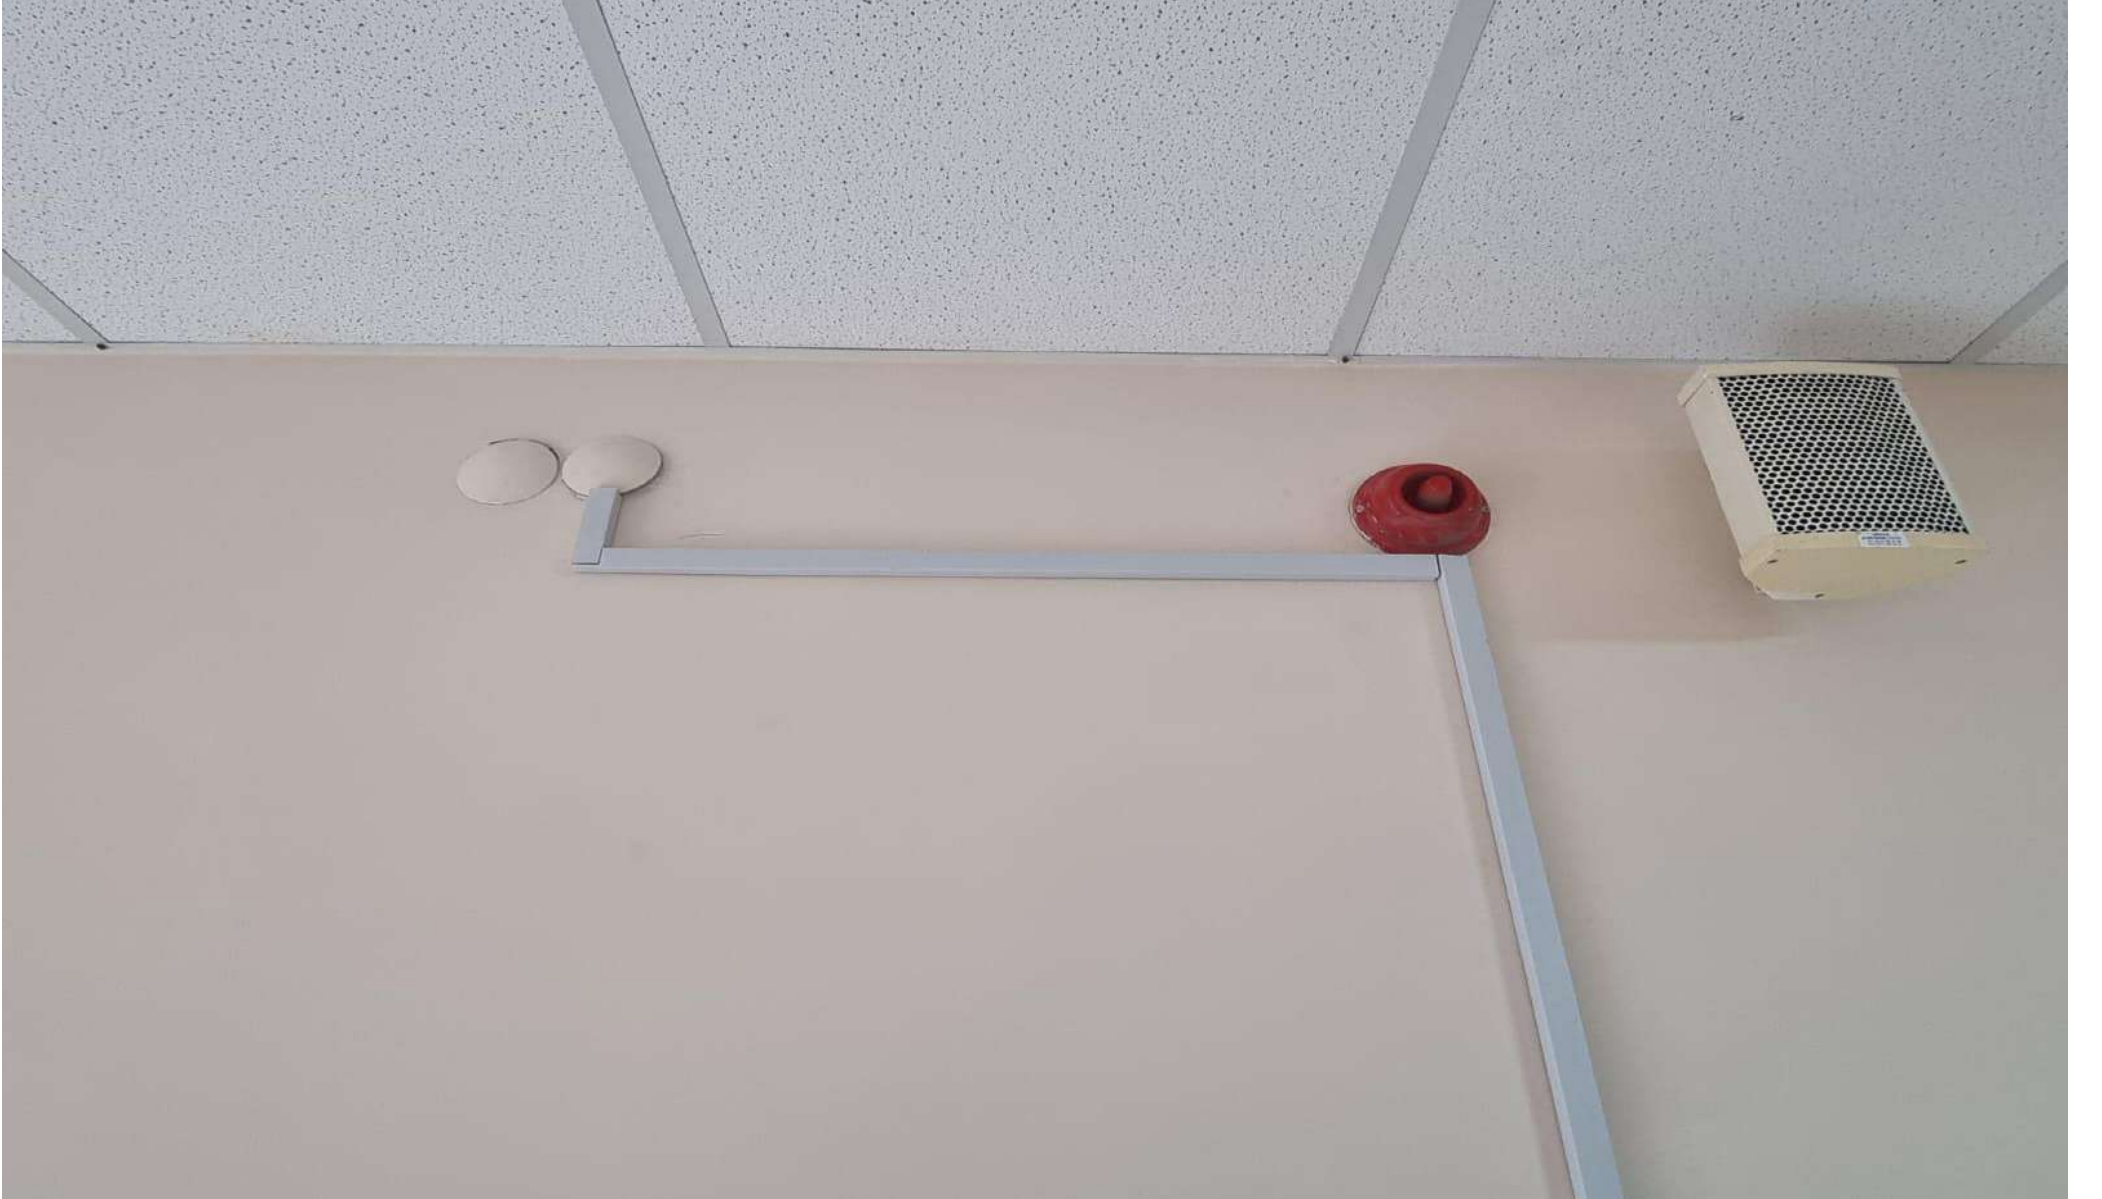



K.Ü. KÜRE MYO BİNASI TADİLATI

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Muhtelif İşler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 06.11.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2025/1388682 | Sözleşme Bedeli | 757.164,00 ₺ |
| İhale Tarihi | 17.09.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 0,00 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 07.10.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 838.236,12 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 08.10.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 838.236,12 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 30 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici kabulü yapıldı | Yüklenici | BÜNYAMİN BİLEN |






| 2025 YILI KÜ MERKEZ KAMPÜS BİNALARIN BAKIM ONARIM | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | Muhtelif İşler | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | 2025/1476593 | Sözleşme Bedeli | 1.747.293,39 ₺ |
| İhale Tarihi | 24.09.2025 | İş Artış/Azalış Miktarı | 275.120,92 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 0,00 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 08.10.2025 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 2.212.390,76 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 13.10.2025 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 2.212.390,76 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 50/7 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici kabul aşamasında | Yüklenici | DOĞUKAN TAHA DOĞAN |

2025 YILI KÜ İLÇEDEKİ OKULLARIN BAKIM ONARIM

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Muhtelif İşler</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | <i>2025/1482190</i> | Sözleşme Bedeli | <i>2.996.570,94 ₺</i> |
| İhale Tarihi | <i>02.10.2025</i> | İş Artış/Azalış Miktarı | <i>592.107,37 ₺</i> |
| İhale Türü | <i>Yapım-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>0,00 ₺</i> |
| Sözleşme Tarihi | <i>22.10.2025</i> | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>4.107.644,12 ₺</i> |
| Yer Teslim Tarihi | <i>27.10.2025</i> | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>4.107.644,12 ₺</i> |
| Süre/Ek Süre | <i>50 Takvim Günü</i> | Fiziki Gerçekleşme Oranı | <i>%100</i> |
| İşin Son Durumu | <i>Geçici kabul aşamasında</i> | Yüklenici | <i>DOĞUKAN TAHA DOĞAN</i> |

ERİŞİLEBİLİRLİK

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Muhtelif İşler</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | — |
| İhale Kayıt No: | <i>2025/1485998</i> | Sözleşme Bedeli | <i>4.598.355,00 ₺</i> |
| İhale Tarihi | <i>03.10.2025</i> | İş Artış/Azalış Miktarı | <i>578.173,33 ₺</i> |
| İhale Türü | <i>Yapım-Açık</i> | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>0,00 ₺</i> |
| Sözleşme Tarihi | <i>23.10.2025</i> | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>6.136.468,00 ₺</i> |
| Yer Teslim Tarihi | <i>27.10.2025</i> | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | <i>6.136.468,00 ₺</i> |
| Süre/Ek Süre | <i>50 Takvim Günü</i> | Fiziki Gerçekleşme Oranı | <i>%100</i> |
| İşin Son Durumu | <i>Geçici kabul aşamasında</i> | Yüklenici | <i>ÖNDER NERGİZOĞLU</i> |

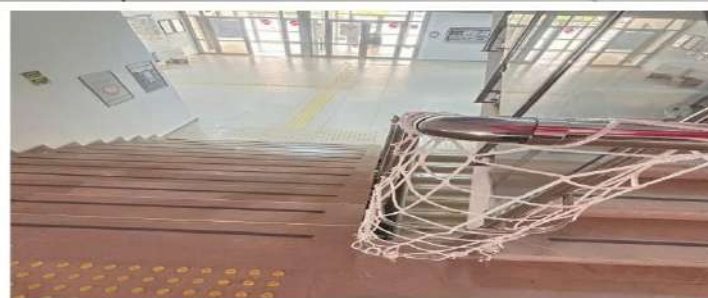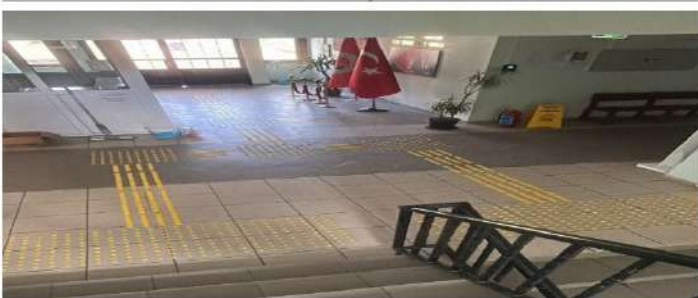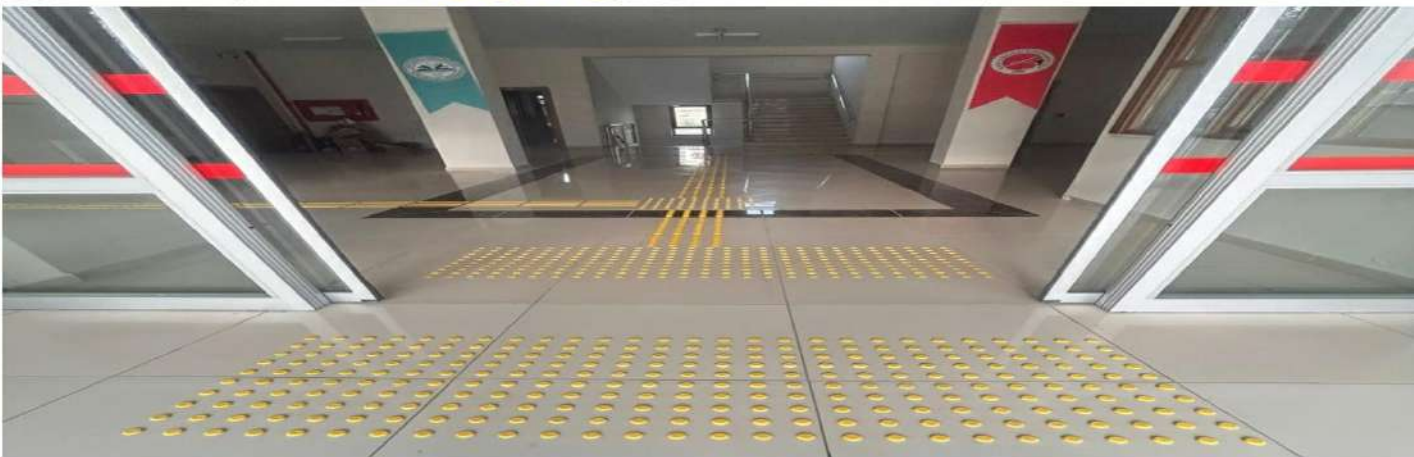

- 6. Proje Numarası** : 2022I00-211035
Proje Adı : Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Başlama – Bitiş Yılı : 2022-2026

2025 Bütçe Kanunu ile **2.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda **10.002.000,00 ₺**'ye ulaşan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

- Adı geçen projeden 30.10.2025 tarihinde 2025/1652050 İhale Kayıt Numarası ile Kastamonu Üniversitesi 250 Yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi ihalesine çıkmış olup, 10.12.2025 tarihinde İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

- 7. Proje Numarası** : 2022I00-211049
Proje Adı : Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Başlama – Bitiş Yılı : 2022-2026

2025 Bütçe Kanunu ile **149.996.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **269.996.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **257.948.464,72 ₺**'si harcanmıştır.

| DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| YAPILAN İŞLER | 2025 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | 2025 YILI TOPLAM HARCAMA | İŞİN SON DURUMU |
| Kastamonu Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Hastanesi | 269.996.000,00 ₺ | 257.948.464,72 ₺ | Kabulü yapıldı. |

| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | | | |
|---|--|--|--|
| Yer Aldığı Yatırım Projesi | <i>Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi</i> | Geçici Kabul İtibar Tarihi | 08.12.2025 |
| İhale Kayıt No: | 2023/931818 | Sözleşme Bedeli | 247.813.013,13 ₺ |
| İhale Tarihi | 09.10.2023 | İş Artış/Azalış Miktarı | 11.091.760,83 ₺ |
| İhale Türü | Yapım-Açık | Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 176.918.486,80 ₺ |
| Sözleşme Tarihi | 27.10.2023 | 2025 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 257.948.464,73 ₺ |
| Yer Teslim Tarihi | 03.11.2023 | Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil) | 434.866.951,53 ₺ |
| Süre/Ek Süre | 700 Takvim Günü | Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |
| İşin Son Durumu | Geçici kabulü yapıldı | Yüklenici | BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. |







| BAKIM ONARIM EKİBİ TARAFINDAN YAPILAN İMALATLAR | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--|---|
| İMALAT ADI | YAKLAŞIK İMALAT MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ | BİRİM İŞÇİLİK MALİYETİ (2025 Fiyatlarıyla) | TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ (2025 Fiyatlarıyla) |
| Boya İmalatı | 85.000 | m ² | 130 | 11.050.000,00 ₺ |
| Çimento Harçlı Sıva İmalatı | 500 | m ² | 285 | 142.500,00 ₺ |
| Saten-Alçı Sıva İmalatı | 2100 | m ² | 480 | 1.008.000,00 ₺ |
| Kalekim imalatı | 1600 | m ² | 250 | 412.500,00 ₺ |
| Seramik İmalatı | 1600 | m ² | 286 | 457.600,00 ₺ |
| Andezit Kaplama | 1500 | m ² | 1125 | 1.687.500,00 ₺ |
| Parke Döşeme | 800 | m ² | 430 | 344.000,00 ₺ |
| Bordür İmalatı | 600 | m | 125 | 75.000,00 ₺ |
| Korge İmalatı | 200 | m | 130 | 26.000,00 ₺ |
| | | | TOPLAM | 15.203.100,00 ₺ |

Yukarıdaki tabloda Bakım Onarım Ekibimiz tarafından yapılan bazı inşaat kalemlerine ait işçilik maliyetleri hesaplanmış olup, bu işlerin yüklenici marifetiyle yaptırılması halinde oluşabilecek ilave maliyetlerin önüne geçilerek kamu kaynağından tasarruf sağlanmıştır.

| DIŞ PAYDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SAĞLANAN İŞ MAKİNESİ DESTEĞİ | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| İŞ MAKİNESİNİN CİNSİ | ÇALIŞMA SÜRESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | BİRİM MALİYET (₺) | TOPLAM MALİYET (₺) |
| Ekskavatör | 25 | Saat | 5.000 | 125.000 |
| Loder | 48 | Saat | 4.000 | 192.000 |
| Kamyon | 50 | Sefer | 3.000 | 150.000 |
| Greyder | 41 | Saat | 4.000 | 164.000 |
| Loder | 26 | Saat | 4.000 | 104.000 |
| Kamyon | 11 | Sefer | 3.000 | 33.000 |
| Dozer | 144 | Saat | 5.000 | 720.000 |
| Beko Loder | 12 | Saat | 2.500 | 30.000 |
| Ekskavatör | 15 | Saat | 5.000 | 75.000 |
| Lowbed | 12 | Saat | 3.000 | 36.000 |
| Kamyon | 60 | Sefer | 3.000 | 180.000 |
| Ekskavatör | 22 | Saat | 5.000 | 110.000 |
| Loder | 28 | Saat | 4.000 | 112.000 |
| Kamyon | 20 | Sefer | 3.000 | 60.000 |
| Tır | 10 | Sefer | 7.000 | 70.000 |
| Loder | 20 | Saat | 4.000 | 80.000 |
| Ekskavatör | 16 | Saat | 5.000 | 80.000 |
| TOPLAM | | | | 2.321.000 |

İhtiyaç duyulan iş makineleri, dış paydaşların katkılarıyla herhangi bir bedel ödenmeksizin temin edilmiş; bu sayede makine kiralama yoluyla oluşabilecek maliyetlerin önüne geçilerek bütçe üzerinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır.







ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız tarafından 2025 yılında yapılan faaliyetler aşağıda listelenmiştir.

- ✓ Dünya Bankası tarafından fonlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Üniversitemize Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup çağrı mektubu süreci devam etmektedir.
- ✓ ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası güncellenmiştir.
- ✓ 2025 yılı enerji tüketimlerine ait veriler birimlerden talep edilerek Enverportal sistemine işlenmiştir.
- ✓ 2025 yılı enerji tüketimlerine ait verilerin Enerji Tüketim Takip Sistemine yüklenmesi ile ilgili birimlere online ve yüz yüze eğitimler verilmiştir.
- ✓ Birimler tarafından Enerji Tüketim Takip Sistemine yüklenen veriler dosyalanmıştır.
- ✓ Binalara ait koridorlarının yaklaşık %60 oranında aydınlatma elemanlarının kontrollerini sağlayan hareket sensörleri kullanılmaya başlanmıştır.
- ✓ Enerji verimliliğinin artırılmasını yönelik olarak LED dönüşümleri, termostatik vana değişimleri, vana yalıtım ceketlerinin kullanılması, cihaz bakım ve onarımlarının yapılarak enerji verimliliği çalışmaları yürütülmüştür.

INTERNATIONAL FIRST CERTIFICATION

IFC[®]
GLOBAL

SERTİFİKA

Kastamonu Üniversitesi

Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No:19
Merkez, Kastamonu
Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı No:29 37200 Merkez,
Kastamonu

IFC Global Sertifikasyon, yukarıda adı geçen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygun olduğunu teyit eder.

Standard:

ISO 50001:2018

Kapsam:

Eğitim faaliyetleri, araştırma ve bilgi üretilen kurum faaliyetleri

İlk Yayın Tarihi : 2.07.2024
Yayın Tarihi : 14.07.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 13.07.2026
Sertifika Bitiş Tarihi : 1.07.2027
Sertifika No : IFC-E-7-24-2155



TÜRKAK BDS NO
YS-C8AF-F310

[Signature]
Çınay



IFC GLOBAL SERTİFİKASYON MUAYENE VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adalet Mah. 2132/2 Sokak No:3 Trend Office D:45 Bayraklı İZMİR TÜRKİYE T: +90 850 304 35 00 F: +90 850 304 35 00

www.ifcglobal.com.tr info@ifcglobal.com.tr

ERİŞEBİLİRLİK KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi, Makina Atölyesi, Turizm Fakültesi, İnebolu Meslek Yüksekokulu, Cide Meslek Yüksekokulu, Taşköprü Meslek Yüksekokulunda bulunan Engelli Tuvaletleri standartlara uygun ölçülerde tekrar dizayn edildi.



- ✓ İlçe meslek yüksekokullarında, Rektörlük Binasında, İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Makina Atölyesi, Turizm Fakültesi, Ahşap İnovasyon Merkezi Binalarımızda engelli tuvaletlerindeki tefrişatlar takıldı.




- ✓ İç ve dış mekanlarda eksik olan paslanmaz çelik merdiven korkulukları tamamlandı.




- ✓ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme ve Denetleme Formu gereği merkez binalarımıza ve bazı ilçe meslek yüksekokulu binalarımıza sesli ışıklı acil çıkış anons cihazı yangın merdivenlerimizin üzerine monte edildi.



- ✓ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme ve Denetleme Formu gereği merkez binalarımıza braille alfabesi de bulunan bina bilgilendirme panoları asıldı.

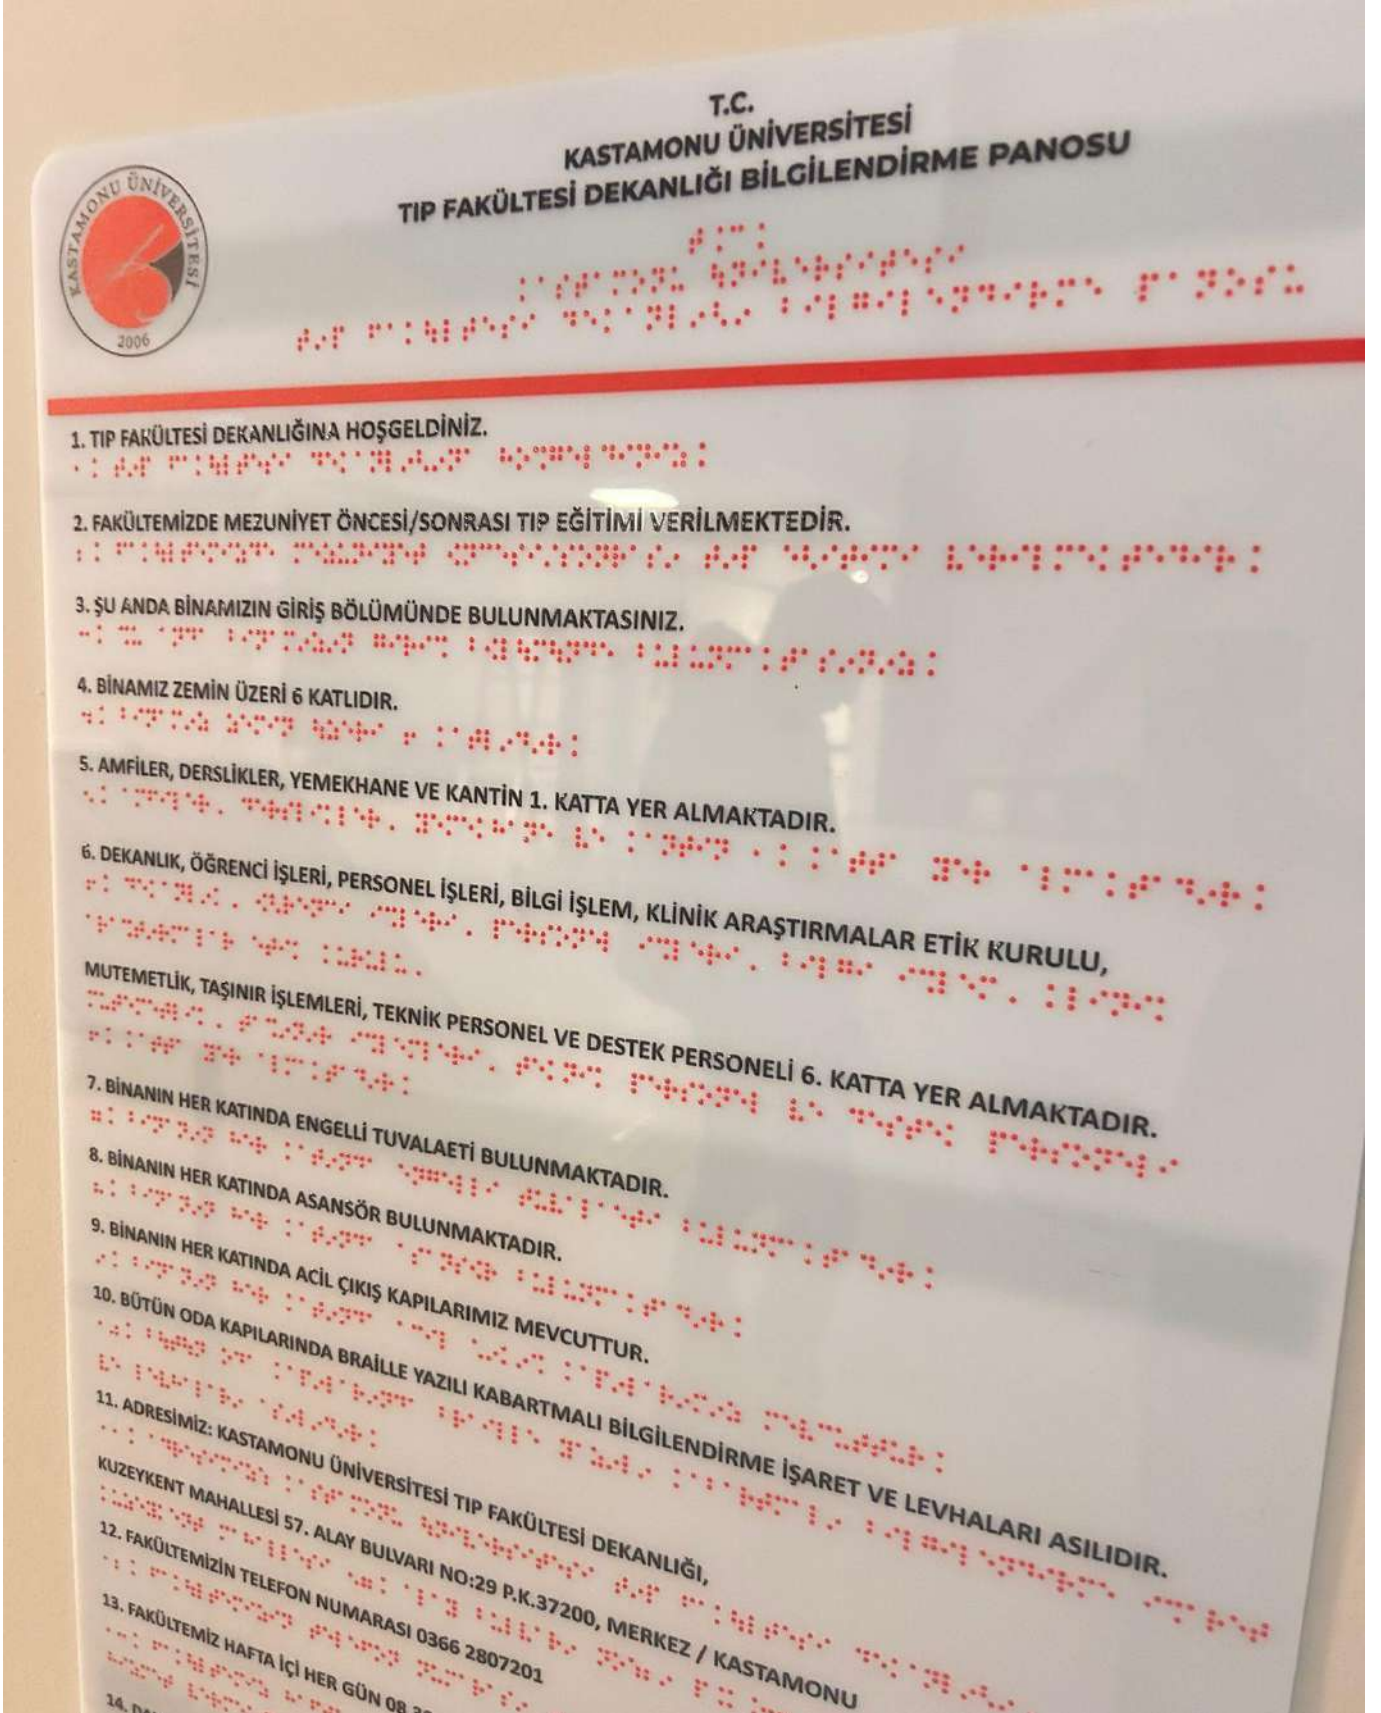

- ✓ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme ve Denetleme Formu gereği merkez binalarımıza ve ilçe meslek yüksekokulu binalarımıza ışıklı askı sistemi asansöre yönlendirme levhaları takıldı.

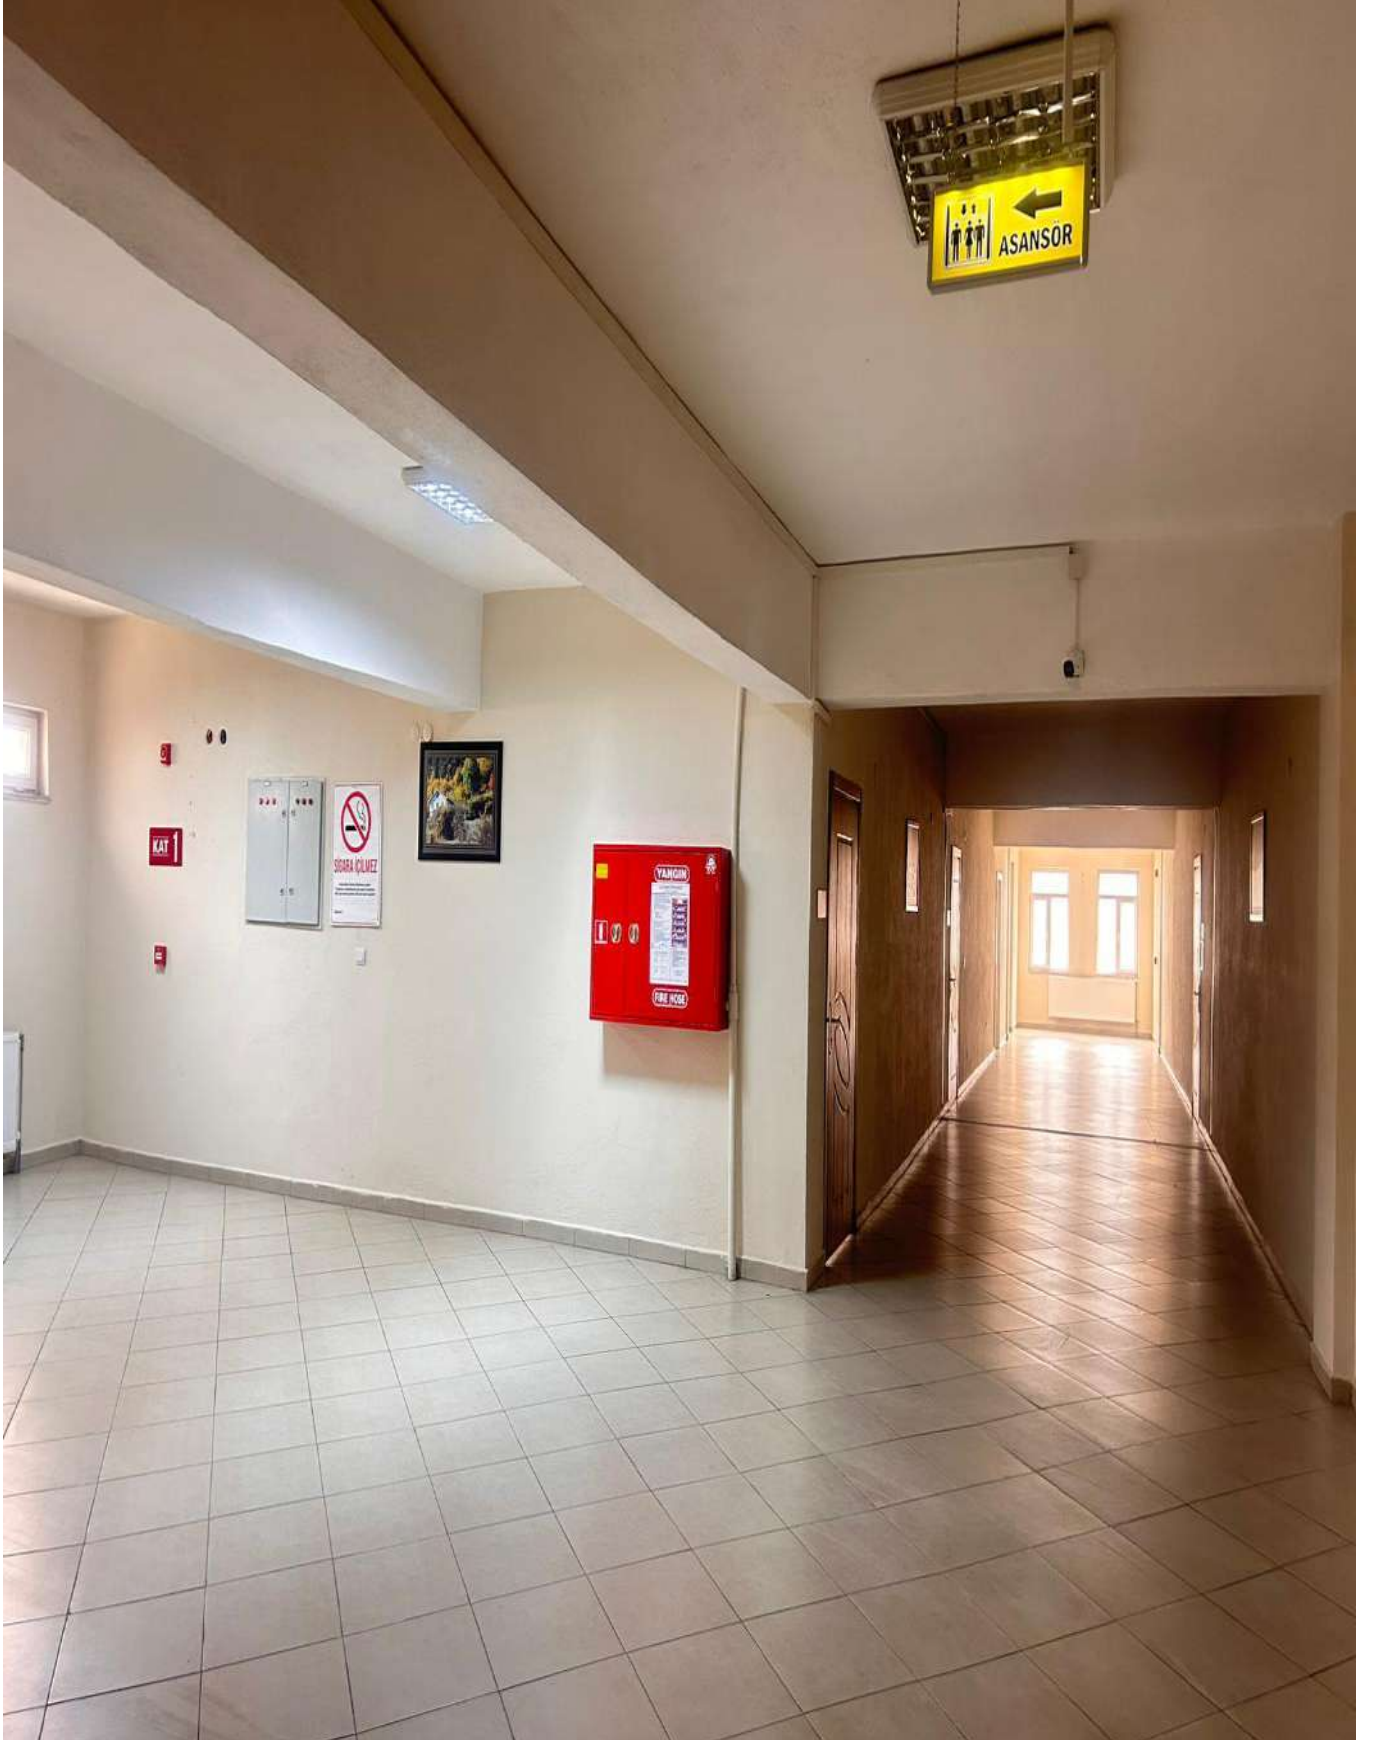

- ✓ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme ve Denetleme Formu gereği merkez binalarımıza ve ilçe meslek yüksekokulu binalarımıza asansör kullanma talimatı levhaları takıldı.




- ✓ İlçe meslek yüksekokullarında ve merkezde Ahşap İnovasyon Merkezi, Veteriner Fakültesi derslikleri engelli otoparklarına yatayda otopark çizimi yapıldı ve dikey levhalar takıldı.




- ✓ Bütün ilçe meslek yüksekokulu binalarımızda ve merkezde eksik olan yerlerin cam bandı uygulaması tamamlandı.



- ✓ Bütün ilçe meslek yüksekokulu binalarımızda ve merkezde engelli otoparkına ve engelsiz bina girişine yönlendirme levhaları yerleştirildi.

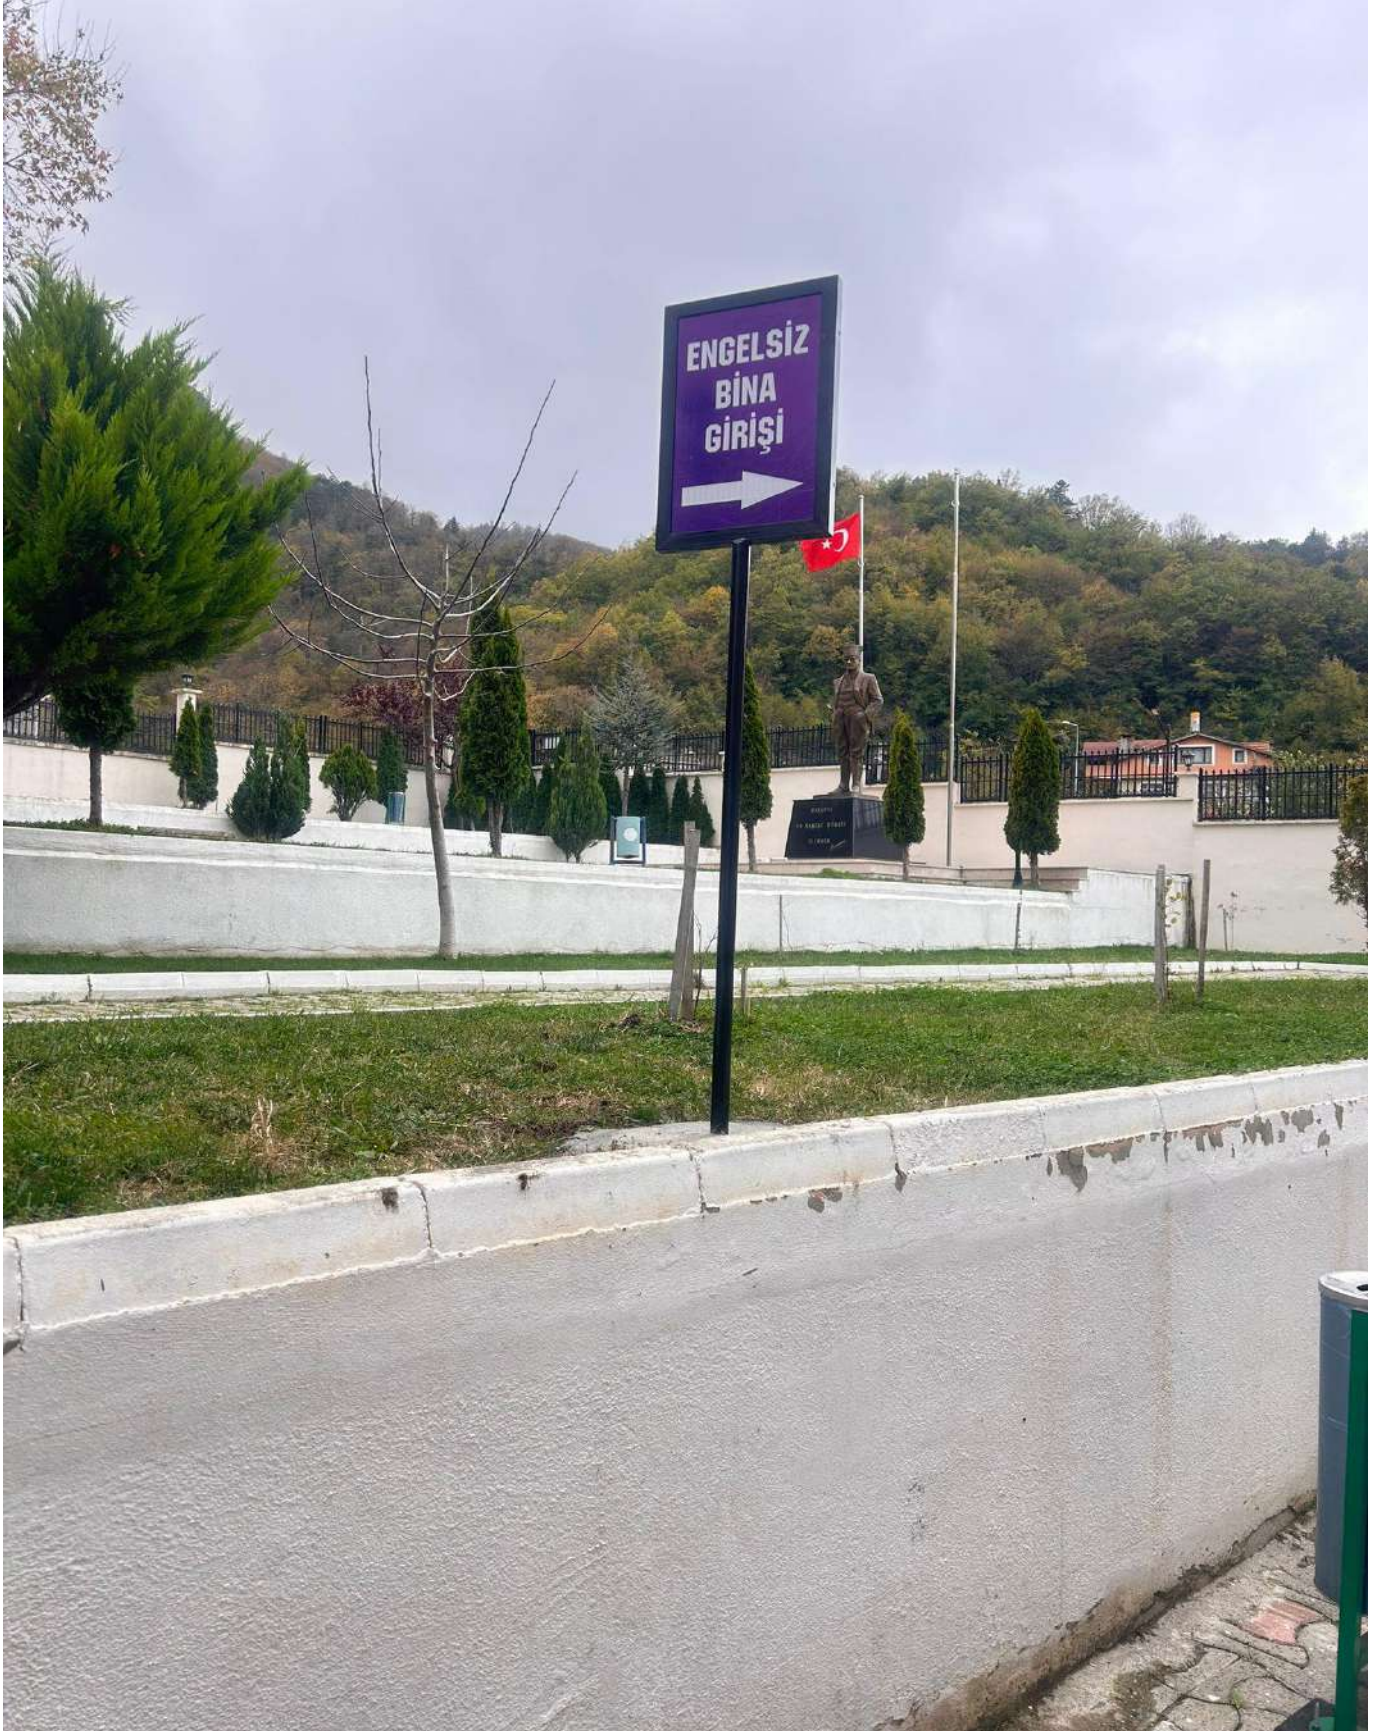


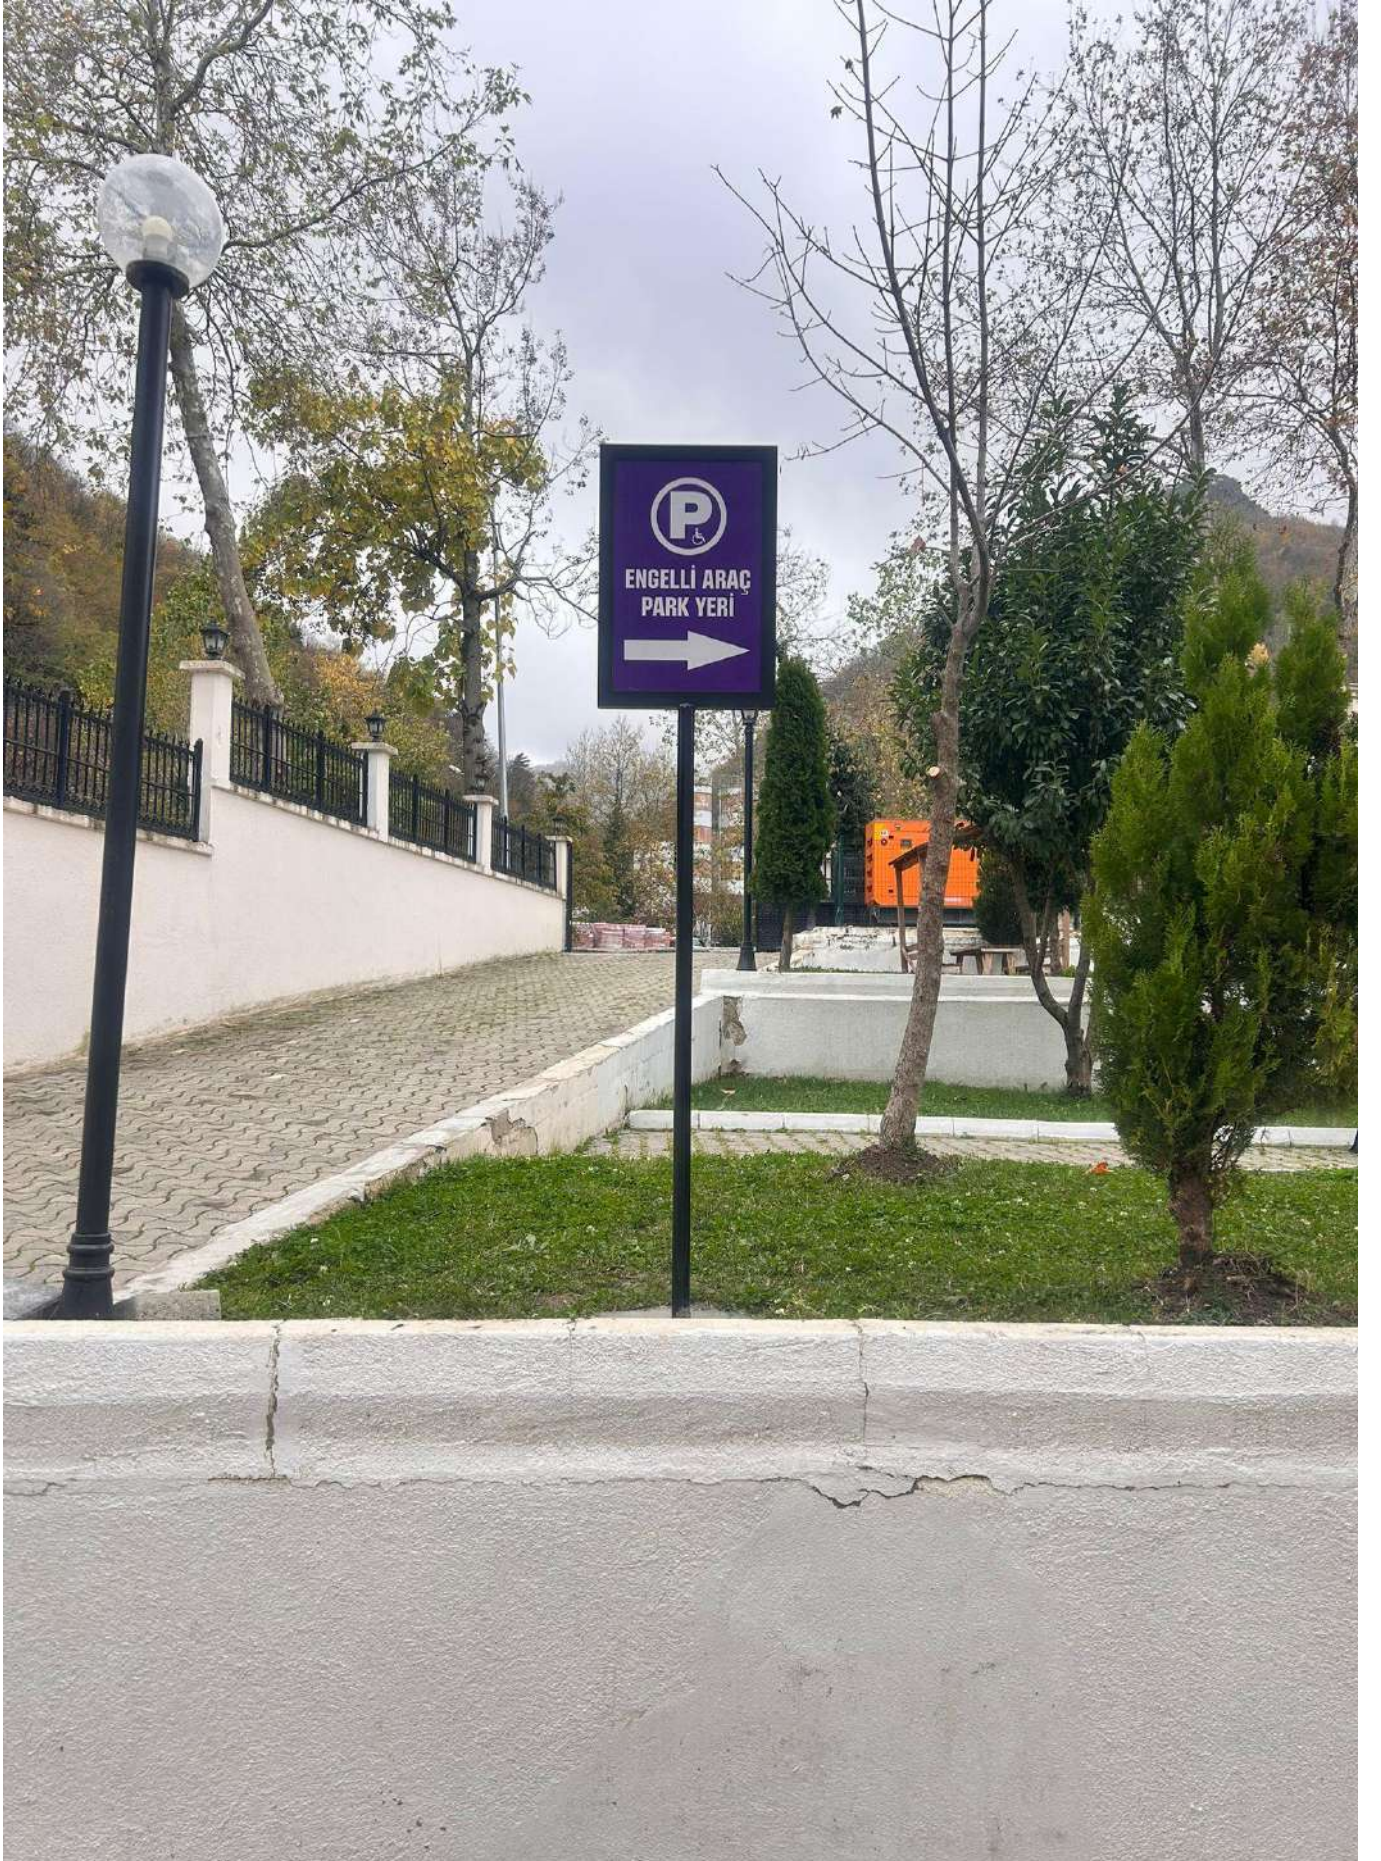

- ✓ Bütün ilçe meslek yüksekokulu binalarımızda ve merkezde eksik olan yerlerin kat planı ve krokileri yerleştirildi.



- ✓ Bütün ilçe meslek yüksekokulu binalarımızda hissedilebilir yüzey uygulamaları tamamlanmıştır.

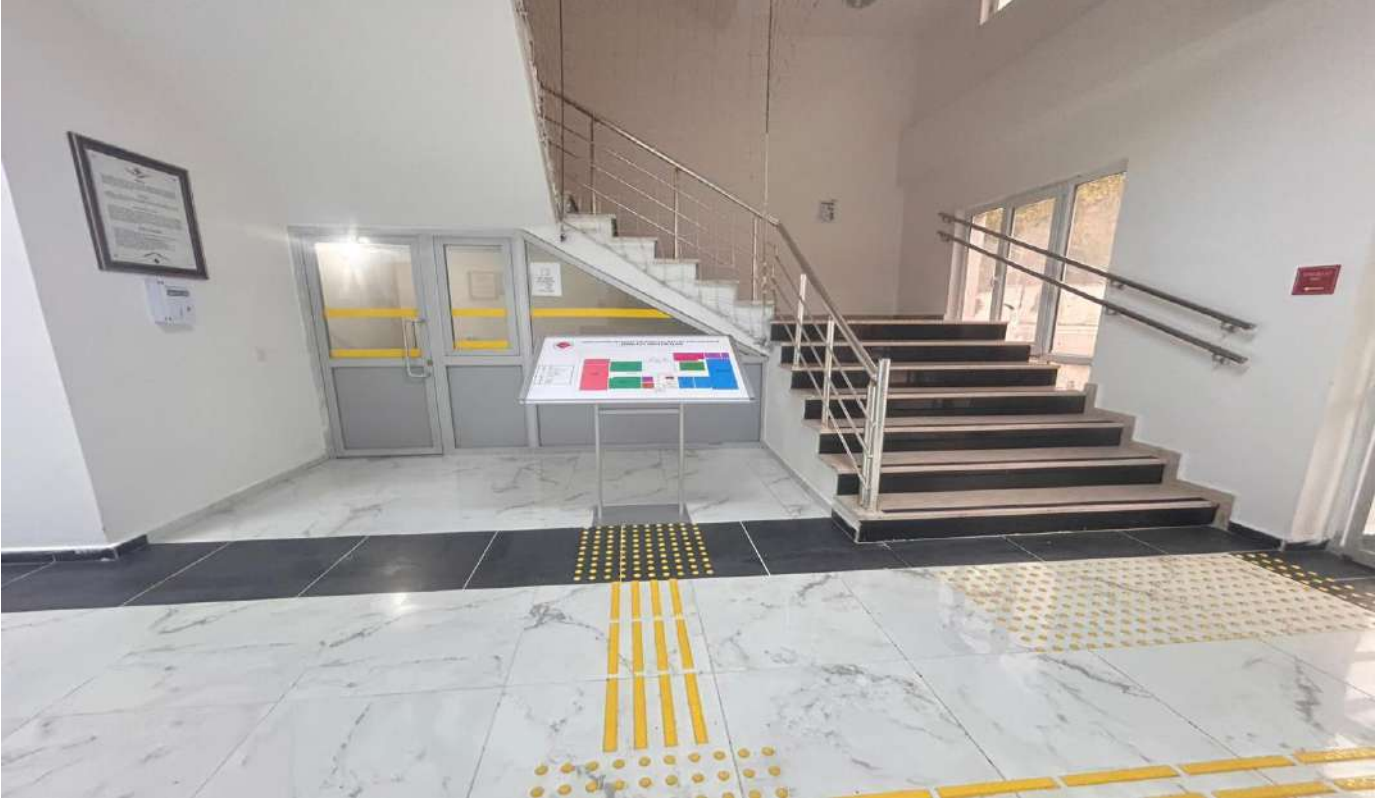

- ✓ Bütün ilçe meslek yüksekokulu binalarımızda merdiven kaydırmaz uygulamaları tamamlanmıştır.



2025 YILINDA YAPILAN İHALELERİMİZ

| Sıra Numarası | İhale Kayıt Numarası | İhalenin Adı | Yatırım Proje Numarası | İhale Tarihi | Sözleşme Tarihi | Sözleşme Bedeli | Yüklenici |
|---------------|----------------------|--|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 2025/1485998 | <i>Erişilebilirlik</i> | 2025H03-258335 | 3.10.2025 | 23.10.2025 | 4.598.355,00 | <i>ÖNDER NERGİZOĞLU</i> |
| 2 | 2025/1482190 | <i>2025 Yılı KÜ İlçedeki Okulların Bakım Onarım</i> | 2025H03-258335 | 2.10.2025 | 22.10.2025 | 2.996.570,94 | <i>DOĞUKAN TAHA DOĞAN</i> |
| 3 | 2025/1476593 | <i>2025 Yılı KÜ Merkez Kampüs Binaların Bakım Onarım</i> | 2025H03-258335 | 24.09.2025 | 8.10.2025 | 1.747.293,39 | <i>DOĞUKAN TAHA DOĞAN</i> |
| 4 | 2025/1388682 | <i>KÜ Küre MYO Binası Tadilatı</i> | 2025H03-258335 | 17.09.2025 | 7.10.2025 | 757.164,00 | <i>BÜNYAMİN BİLEN</i> |
| 5 | 2025/1198298 | <i>K Ü Yangın İhbar Santralinin</i> | 2025H03-258335 | 26.08.2025 | 15.09.2025 | 2.947.227,00 | <i>İSMAİL YÜKSEL</i> |
| 6 | 2025/1122614 | <i>Kastamonu Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Tadilat İşleri</i> | 2024H03-233409 | 19.08.2025 | 9.09.2025 | 4.188.013,40 | <i>MN YILDIZ GRUP ENERJİ İNŞAAT GIDA VE İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</i> |
| 7 | 2025/1114894 | <i>KÜ Çevre ve Altyapı Elektrik İşleri</i> | 2024H03-233410 | 18.08.2025 | 2.09.2025 | 2.858.058,58 | <i>58 AKIN AVAN YAPI İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</i> |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----------------|------------|------------|---------------|--|
| 8 | 2025/619023 | 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal 4-6. grup | 2025H03-258335 | 23.05.2025 | 20.06.2025 | 660.000,00 | ÖNDER NERGİZOĞLU |
| | | 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere mal 5-8 grup | 2025H03-258335 | 23.05.2025 | 19.06.2025 | 2.423.875,00 | APE ELEKTRİK MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | | 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere mal 2-7. grup | 2025H03-258335 | 23.05.2025 | 19.06.2025 | 2.042.609,00 | İPEK HIRDAVAT DEMİR ÇELİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
| | | 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal 1-3. grup | 2025H03-258335 | 23.05.2025 | 18.06.2025 | 2.789.400,00 | MERİDYEN TESİSAT YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | | 2025 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal 9-10. grup | 2025H03-258335 | 23.05.2025 | 17.06.2025 | 286.732,00 | ERTÜRK AYDINLATMA ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 9 | 2025/552728 | KÜ Doğalgaz Dönüşüm | 2024H03-233410 | 7.05.2025 | 21.05.2025 | 12.577.000,00 | YAPİTES MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| 10 | 2025/412727 | Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Kapalı Manej Yapım İşi | 2025H03-258335 | 15.04.2025 | 7.05.2025 | 7.764.122,00 | SEFA KAPAKLI DSK MÜHENDİSLİK |
| 11 | 2025/406075 | Levent Semizer Spor Salonu Deprem Güçlendirme | 2025H03-258335 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 7.794.229,78 | ZEKİ YALNIZ |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|------------|------------|----------------|--|
| 12 | 2024/1442102 | <i>KÜ Eğitim ve Kültür Kampüsü Merkezi Derslik Binası</i> | 2008H03-935 | 27.11.2024 | 15.04.2025 | 249.513.013,13 | <i>BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.</i> |
| 13 | 2025/243808 | <i>2025 Yılı Asansör Revizyonları</i> | 2025H03-258335 | 18.03.2025 | 14.04.2025 | 3.590.000,00 | <i>İSTİKLAL ASANSÖR İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</i> |
| 14 | 2025/245131 | <i>Merkez Kampüs İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme</i> | 2024H03-233410 | 12.03.2025 | 2.04.2025 | 9.494.839,50 | <i>EREN BAKKAL</i> |
| 15 | 2025/186790 | <i>Öğrenci Evi Binaları ve Bozkurt MYO Çatı Kaplaması Değişim</i> | 2025H03-258335 | 28.02.2025 | 20.03.2025 | 2.767.308,10 | <i>BURAK KARTAL</i> |
| 16 | 2025/24112 | <i>2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım Onarım İşİ</i> | 2025H03-258335 | 28.01.2025 | 13.02.2025 | 708.200,00 | <i>İSTİKLAL ASANSÖR İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</i> |

2025 YILINDA İPTAL EDİLEN İHALELERİMİZ

| Sıra Numarası | İhale Kayıt Numarası | İhalenin Adı | İhale Tarihi | İptal Tarihi | İptal Gerekçesi |
|---------------|----------------------|---|--------------|--------------|---|
| 1 | 2025/1652050 | <i>Kastamonu Üniversitesi 250 Yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Proje Hazırlama</i> | 5.12.2025 | 10.12.2025 | <i>İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle</i> |
| 2 | 2025/1266874 | <i>2025 Yılı KÜ Binaların Bakım ve Tadilat İşi</i> | 9.09.2025 | 9.09.2025 | <i>İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle</i> |
| 3 | 2025/379632 | <i>KÜ Doğalgaz dönüşüm</i> | 8.04.2025 | 9.04.2025 | <i>İdari Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle</i> |

| İHALE USULLERİ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| İhale Türü | Açık İhale 4734/19 | | | Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 | | | Pazarlık Usulü 4734/21 | | | Genel Toplam | | | Doğrudan Temin 4734/22-d | |
| | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan İhalelerin Tutarı | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan İhalelerin Tutarı | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan İhalelerin Tutarı | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan İhalelerin Tutarı | Alım Sayısı | İhalelerin Tutarı |
| Mal Alımı | 1 | — | 8.202.616,00 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 8.202.616,00 | 15 | 778.591,29 |
| Hizmet Alımı/Danışmanlık Hizmet Alımı | 2 | — | 4.298.200,00 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 4.298.200,00 | 10 | 1.257.080,00 |
| Yapım İşi | 13 | 2 | 310.003.194,82 | — | — | — | — | — | — | 13 | 2 | 310.003.194,82 | 4 | 354.333,60 |
| TOPLAM | 16 | 2 | 322.504.010,82 | 0 | 1 | — | — | — | — | 16 | 3 | 322.504.010,82 | 29 | 2.390.004,89 |

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1 Üstünlükler

- ✓ Takım çalışması yapılarak işlerin hızla bir şekilde sonuçlandırılması,
- ✓ Özveriyle çalışan personel topluluğuna sahip olunması,
- ✓ Fiziki mekan ve çalışma ekipmanlarına sahip olmak,
- ✓ Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Üniversitenin Stratejik Planı ve Kalite Politikasına uygun olarak çalışmaların yürütülmesine özen gösterilmesi,
- ✓ Birimimiz ile Üniversitenin diğer birimleri arasında güçlü bir iletişim bağının olması,
- ✓ İlimizde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimin güçlü olması ve sağlıklı bilgi alışverişinin yapılabilmesi,

4.2 Zayıflıklar

- Ödenek yetersizliği nedeniyle personelin inceleme, araştırma, teknik gezi ve fuarlara katılamaması,
- Ödenek yetersizliği nedeniyle bakım onarım taleplerinin karşılanamaması,
- Konusunda uzman donanımlı ve tecrübe sahibi personel bulmada yaşanan zorluklar,
- Personel sayısının yetersizliği,

4.3 Değerlendirme

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin bütçenin önemli bir kısmını oluşturması mali evraklara dayalı hesap verme yükümlülüğünün diğer birimlere göre daha fazla olmasına neden olmaktadır. Başkanlığımız birim personelinin hata yapma lüksünün olmadığı birimlerin başında gelmektedir.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımız faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ödeneklerin artırılması gerekmektedir. Ayrıca personelin meslekleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebilmeleri amacıyla teknik gezi, fuar vb. etkinliklere katılımlarının sağlanması, personelin moral ve motivasyonunu artırıcı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve performansa dayalı ödüllendirme sisteminin de uygulanması önem arz etmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Kastamonu-Ocak 2026)

Esat ÇELİK
Daire Başkanı
