



2023 YILI İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

OCAK 2024

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

1. Genel Bilgiler
 - 1.1 Misyona, Vizyona, Kalite Politikası
 - 1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar
 - 1.3 Birime İlişkin Bilgiler
 - 1.3.1 Fiziki Yapı
 - 1.3.2 Teşkilat Yapısı
 - 1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
 - 1.3.4 İnsan Kaynakları
 - 1.3.5 Sunulan Hizmetler
 - 1.3.5.4 Kalite Yönetim ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları
 - 1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
2. Amaç ve Hedefler
 - 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
 - 2.2 Birimin Amaç ve Hedefleri
3. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
 - 3.1 Mali Bilgiler
 - 3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları
 - 3.1.2 Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar
 - 3.1.3 Mali Denetim Sonuçları
 - 3.2 Performans Bilgileri
 - 3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri
4. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
 - 4.1 Üstünlükler
 - 4.2 Zayıflıklar
 - 4.3 Değerlendirme
5. Öneri ve Tedbirler

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizin bakım, onarım, işletme, yeni projelerin hazırlanması ve gerekli olan hizmet binalarının yapılmasında sorumluluk sahibi olup, çalışmalarına Üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçlarına uygun şekilde devam etmektedir. 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Raporunda ortaya çıkan veriler aynı zamanda birimimizin 2023 yılı performansının da bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan veriler doğrultusunda hem üniversitemiz hem de kamuoyu birimimizin performansını değerlendirme olanağı bulacaktır.

2023 yılı birim faaliyet raporunu oluşturan projelerin ve hizmetlerin gerçekleştirilerek birim faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Esat ÇELİK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Misyon Vizyon ve Kalite Politikası

1.1.1 Misyonumuz

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

1.1.2 Vizyonumuz

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Ayrıca bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için zoru başarmak, imkânsız zora dönüştürmektir.

1.1.3 Kalite Politikamız

- Stratejik planda belirtilen hedef ölçüt ve amaçların gerçekleştirilmesini,
- İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,
- Birim bazında kalite bilincinin geliştirilmesini,
- Ekip çalışmasını etkin kılarak kalite düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesini,
- Çözüm odaklı bir yönetim anlayışının benimsenmesini,
- Şeffaf katılımcı ve hesap verilebilirlik temelinde hareket edilmesini,
- Kurumsal risk yönetimi çalışmalarıyla desteklenen ve engelli bireyleri de dikkate alan sağlıklı çevreci güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturulmasını ilke edinen,
- Planla Uygula Kontrol et ve Önlem al yaklaşımını benimseyen bir birim olmak,

1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlığının görevleri

- a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak bakım ve onarım işlerini yapmak

- b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarım ile benzer işleri yürütmek şeklinde belirtilmiştir.

1.3 Birime İlişkin Bilgiler

1.3.1 Fiziki Yapı

1.3.1.1 Hizmet Alanları

Başkanlığımız Kuzeykent kampüsünde yer alan Rektörlük Binasının 3. katında 18 adet çalışma ofisi ve toplam 436,30 m² alanda hizmet vermektedir.

Tablo:1 Birim Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
İdari Personel Hizmet Alanları	18	436,30	35

1.3.1.2 Ambar ve Arşiv Alanları


Tablo:2 Birim Ambar ve Arşiv Alanları

Hizmet Alanları	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	3	123
Arşiv Alanları	1	74,8
TOPLAM	4	197,80

1.3.2 Teşkilat Yapısı

Başkanlığımızın teşkilat yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre

- Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü
- Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
- İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.



1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Başkanlığımız teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına ihtiyaç duyduğu teknolojik ve bilişim altyapısını önemli ölçüde tamamlamıştır. Üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemi ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden faydalanmasının yanı sıra Başkanlığımız AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Programı, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapma imkânı sağlayan AutoCAD, NetCAD, STA4CAD programlarını kullanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımızın yıllık faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporları Başkanlığımız web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

1.3.3.1 Yazılımlar

Tablo:3 Birim Yazılım Kaynak Sayıları

Yazılım	Açıklama
	Başkanlığımız tarafından yapılan yazışmalar ile personel özlük iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden Yatırım Programı hazırlık iş ve işlemleri ile mevcut projelere ait izleme verilerinin girişi ve ödenek talep iş ve işlemleri yürütülmektedir.
	İhale iş ve işlemleri Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülmektedir.
	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi üzerinden Başkanlığa ait bütçe iş ve işlemleri yürütülmektedir.
	Başkanlık tarafından yapılacak ödemelere ait iş ve işlemler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
	Personele ait maaş iş ve işlemleri ile Taşınır iş ve işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
	Personele ait sigorta, işe giriş ve işten ayrılış iş ve işlemleri ile yüklenici firmalara ait borç sorgulama iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.
	T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İl Yatırım Takip Sistemi üçer aylık dönemler halinde yatırım projelerine ait veri giriş iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.
	Üniversitemiz tapu iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne ait olan otomasyondur.

1.3.3.2 Bilgisayar ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo:4 Birim Bilgisayar ve Teknolojik Kaynak Sayıları

	İdari	Eğitim Amaçlı	Toplam
Masaüstü Bilgisayarlar	59	—	59
Dizüstü Bilgisayarlar	4	—	4
Tümleşik Bilgisayar	4	—	4
Bilgisayar Ekranı	55	—	55
Projeksiyon	2	—	2
Barkot Okuyucu	1	—	1
Fotokopi Makinesi	1	—	1
Evrak İmha Makinası	2	—	2
Fotoğraf Makinesi	2	—	2
Lazer Yazıcı	30	—	30
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	5	—	5
Tarayıcı	2	—	2


1.3.4 İnsan Kaynakları

Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 2 Mimar, 10 Mühendis, 12 Tekniker, 8 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni, 9 Sürekli İşçi ve 4 Hizmetli olmak üzere toplam 50 personel **fiili** olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız kadrosunda bulunan 1 Şube Müdürü, 1 Mühendis, 7 Tekniker, 7 Teknisyen, 1 Şoför ve 1 Sözleşmeli Personel 13-b/4 ile farklı birimlere görevlendirilmiştir. Farklı birimlerde görev yapan 9 Sürekli İşçi de 13-b/4 ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.

BAŞKANLIĞIMIZ PERSONEL DAĞILIMI

UNVANI	KADROSU BAŞKANLIĞIMIZDA OLAN PERSONEL	13-B/4 İLE FARKLI BİRİME GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL	13-B/4 İLE BAŞKANLIĞIMIZA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL	FİİLİ OLARAK BAŞKANLIĞIMIZDA GÖREV YAPAN PERSONEL
DAİRE BAŞKANI	1	—	—	1
ŞUBE MÜDÜRÜ	2	1	—	1
ŞEF	2	—	—	2
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1	—	—	1
MİMAR	2	—	—	2
MÜHENDİS	11	1	—	10
TEKNİKER	19	7	—	12
TEKNİSYEN	15	7	—	8
ŞOFÖR	1	1	—	—
HİZMETLİ	4	—	—	4
SÜREKLİ İŞÇİ	—	—	9	9
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1	1	—	—
TOPLAM	59	18	9	50

FİİLİ OLARAK GÖREV YAPAN PERSONEL DAĞILIMI




- DAİRE BAŞKANI
- ŞUBE MÜDÜRÜ
- ŞEF
- BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
- MİMAR
- MÜHENDİS
- TEKNİKER
- SÖZLEŞMELİ PERSONEL
- ŞOFÖR
- HİZMETLİ
- SÜREKLİ İŞÇİ
- TEKNİSYEN

1.3.4.3 İdari Personel


Tablo:5 İdari Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	15	9	24
Teknik Hizmetler	43	35	78
Yardımcı Hizmetler	5	1	6

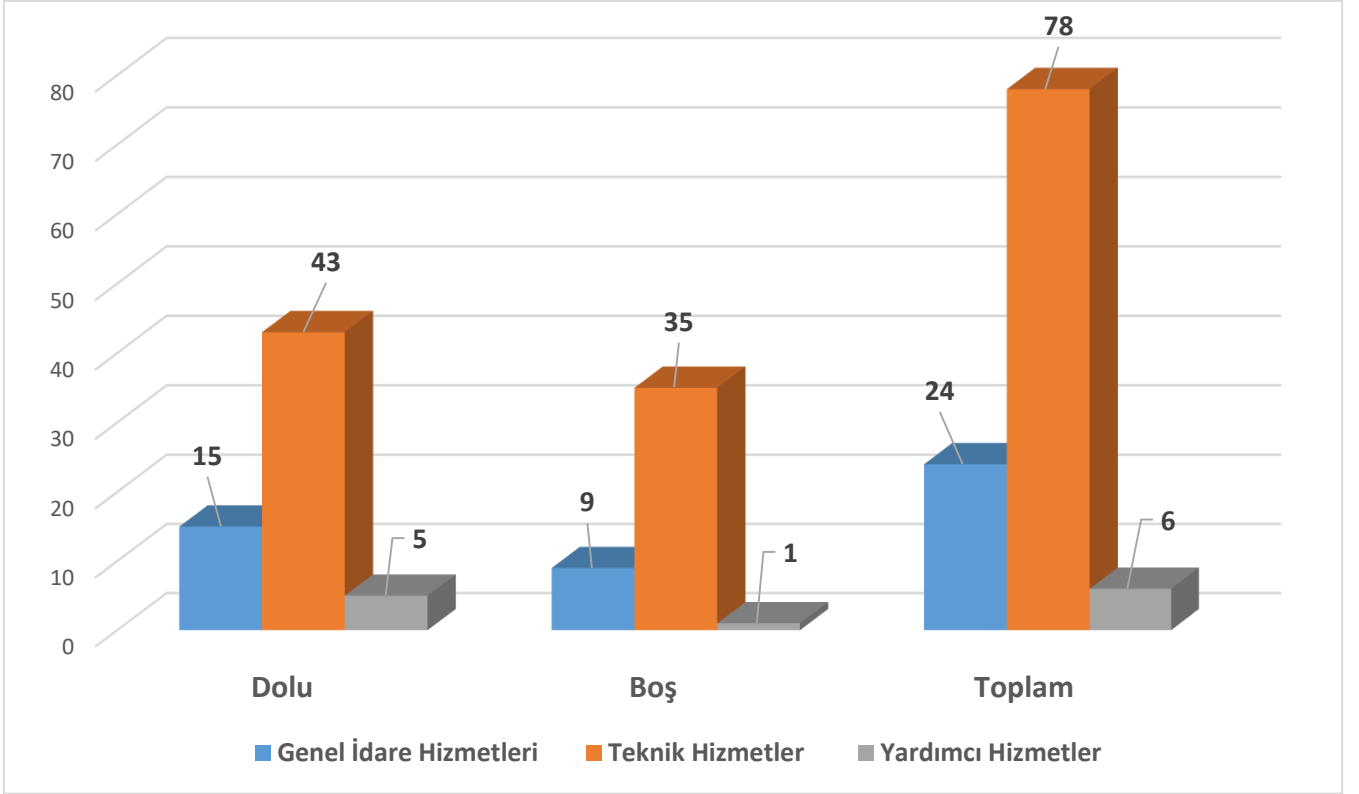


Tablo:6 İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	Ortaöğretim	Önlisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	7	15	33	3
Yüzde	12%	26%	57%	5%




Tablo:7 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı


	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	8	1	2	29	5	13
Yüzde	14%	2%	3%	49%	8%	22%

**Tablo:8 İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı**

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	1	9	4	14	20	10
Yüzde	2%	16%	7%	24%	34%	17%

**Tablo:9 İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı**

	Kadın	Erkek
Kişi Sayısı	6	52
Yüzde	10%	90%



1.3.4.4 Sözleşmeli Personel

Başkanlığımız kadrosunda 1 Sözleşmeli Personel bulunmakta olup, bu personel 2547 sayılı Kanununun 13-b/4 maddesi ile farklı birime görevlendirilmiştir.

Tablo:10 Sözleşmeli Personelin Niteliklerine Göre Dağılımı

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN				
UNVANI	EĞİTİM DURUMU	HİZMET YILI	YAŞ	CİNSİYET
Teknisyen	Ortaöğretim	1	30	Erkek

1.3.4.5 İşçi

Başkanlığımız kadrosunda İşçi statüsünde personel bulunmamakta olup, 10 adet personel 2547 sayılı kanunun 13-b/4 maddesi ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.

1.3.5 Sunulan Hizmetler

- Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak,
- İhale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
- İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,
- Binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek, (Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Telefon)
- Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek Kampus yerleşim planına göre uygulamalarının yapılmasında gerekli kontrollükleri yapmak,
- Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek,
- Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım teklifini ve bütçesini hazırlamak,
- Başkanlığımızda görevli ve kadrolu tüm personelimizin özlük hakları ve mali ödemelerini gerçekleştirmek,
- Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneğinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak,

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerde (Mal ve Malzeme Alımı, Bakım-Onarım Yaptırılması ve Hizmet Alımı) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan alım yöntemiyle yapılarak zamanın ve ödeneğin ekonomik kullanılmasına dikkat edilmiştir.

1.3.5.4 Kalite Yönetim ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları

- ✓ Başkanlığımız Risk Analizi hazırlanarak Birim Web sayfamızda yayımlanmıştır.
- ✓ 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporumuz hazırlanarak Birim Web sayfamızda yayımlanmıştır.

- ✓ 2022 Yılı Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı değerlendirmesi yapıldı
- ✓ 2023 Yılı Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı hazırlanarak Birim Web sayfamızda yayımlanmıştır.
- ✓ 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları kapsamında Başkanlığımızdan talep edilen bilgi ve belgeler hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğüne gönderildi.
- ✓ 2023 yılında mal ve hizmet alımı yapılan firmalara ait Tedarikçi Değerlendirme Formları doldurularak dosyalanmıştır.
- ✓ Başkanlığımızda yapılan toplantılar Toplantı Tutanağı düzenlenmek suretiyle kayıt altına alınmıştır.
- ✓ Başkanlığımız Birim Kalite Komisyonu tarafından yıl içerisinde süreç ile ilgili toplantılar düzenlenmiştir.
- ✓ 23.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen İç Tetkik neticesinde Başkanlığımız **BAŞARILI** bulunmuştur.

1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversite idari teşkilatı içerisinde kurulmuş olup, hiyerarşik olarak Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimin üst yöneticisi Daire Başkanıdır. Daire Başkanlığımız Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Birimin Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Daire Başkanıdır. Birimi ilgilendiren kararlar ilgili Şube Müdürlüğünün önerisi ve Daire Başkanının onayı ile alınmaktadır. Üniversiteyi ilgilendiren kararlar ise üst yönetimin onayı ile alınmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen bakım onarım talepleri işin aciliyeti, önem derecesi ve mevcut bütçe imkanları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonrasında karşılanmaya çalışılmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen yapım talepleri ise (bina, tesis vb) üst yönetimin onaylamasının ardından yatırım programına dahil edilmekte, yatırım programına alınması ve ihtiyaç duyulan ödeneğin Başkanlığımıza tahsis edilmesinin ardından da ihale ve yapım ile ilgili süreç başlatılmaktadır.

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan iç kontrol sisteminin kontrol süreçlerini titizlikle yürütmektedir.

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile ihalesi yapılan gerek yıllara sari işler gerekse mali yılı içinde ödenek tahsis edilen projelerin kontrollük işleri görevlendirilen teknik personel tarafından yapılmaktadır.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1 Temel Politikalar ve Öncelikler

- ✓ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- ✓ Kastamonu Üniversitesi 2020 - 2024 Stratejik Planı
- ✓ Kalkınma Planları ve Yıllı Programı,
- ✓ Orta Vadeli Program,
- ✓ Orta Vadeli Mali Plan,

Yukarıda bahsedilen belgeler ışığında

- Yürürlükte olan mevzuat hükümlerine riayet eden,
- Kaynakları etkin kullanan,
- Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
- Hesap verilebilir,
- Güvenilir,
- Yenilikçi ve yaratıcı,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşmaya önem veren,
- Teknolojiden maksimum düzeyde fayda sağlayan,
- Personelin birlik, beraberlik ve takım ruhu içerisinde hareket etmesine değer veren,
- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı,
- Etik davranış ilkelerine uygun hareket eden güçlü bir yapı oluşturmak temel politika ve hedeflerimiz arasındadır.

2.2 Birimin Amaç ve Hedefleri

Tablo:11 Birimin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak	H1.1: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek
A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak	H2.1: Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak
A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak	H4.1: Tıp fakültesini plan dönemi sonuna kadar tamamlayarak etkin hale getirmek

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1 Mali Bilgiler

Başkanlığımıza 2023 yılı bütçesi ile **181.846.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte toplam ödenek miktarı **200.881.780,00 ₺**'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin **162.716.130,83 ₺**'si harcanmıştır. Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin **%81**'i kullanılmıştır. Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi için çıkılan ihalenin tekrarlanması, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içerisinde yer alan Açık Saha Yapım işine ait ihalenin iptal edilmesi ve bazı imalatlardan yapım aşamasında vaz geçilmesi sebebiyle Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin **38.165.649,17 ₺**'si harcamaya dönüştürülememiştir.

3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo:11 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	HARCAMA ORANI
01-Personel Giderleri	20.164.000,00 ₺	61.580,00 ₺	3.217.000,00 ₺	17.008.580,00 ₺	17.007.882,54 ₺	697,46 ₺	100%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	2.326.000,00 ₺	85.100,00 ₺	164.900,00 ₺	2.246.200,00 ₺	2.246.058,45 ₺	141,55 ₺	100%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.000,00 ₺	2.148.000,00 ₺	327.000,00 ₺	2.427.000,00 ₺	1.892.645,96 ₺	534.354,04 ₺	78%
06-Sermaye Giderleri	158.750.000,00 ₺	73.798.000,00 ₺	53.348.000,00 ₺	179.200.000,00 ₺	141.569.543,88 ₺	37.630.456,12 ₺	79%
TOPLAM	181.846.000,00 ₺	76.092.680,00 ₺	57.056.900,00 ₺	200.881.780,00 ₺	162.716.130,83 ₺	38.165.649,17 ₺	81%

Tablo:12 Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

Faaliyet Kodu	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama/Toplam Ödenek Oranı (%)
756-Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	159.061.000,00 ₺	179.368.000,00 ₺	141.691.137,90 ₺	79%
759-Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	68.000,00 ₺	44.000,00 ₺	0,00 ₺	0%
9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	22.717.000,00 ₺	21.469.780,00 ₺	21.024.992,93 ₺	98%
TOPLAM	181.846.000,00 ₺	200.881.780,00 ₺	162.716.130,83 ₺	81%

3.1.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Başkanlığımızın giderlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen **181.846.000,00 ₺**'lik başlangıç ödeneğimize yıl içinde **76.082.680,00 ₺**'lik ekleme yapılmıştır. Personel Giderleri için **17.007.882,54 ₺**, Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri için **2.246.058,45 ₺**, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **1.892.645,96 ₺**, Sermaye Giderleri için **141.569.543,88 ₺** harcanmıştır. Yılsonu toplam harcamamız **162.716.130,83 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

3.1.3 Mali Denetim Sonuçları

Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından 07.08.2023-19.09.2023 tarihleri arasında Başkanlığımızın da aralarında bulunduğu Üniversitemiz İdari Birimlerine ait 2022 Yılı Doğrudan Temin işlemleri denetlenmiş olup, yapılan denetim neticesinde 8 adet bulguya rastlanılmıştır. Bu bulgular:

- Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Sorgusunun Mevzuatın Öngördüğü Şekilde Yapılmaması
 - Yerine Getirilmesi Belli Bir Süreyi Gerektiren Doğrudan Temin Alımlarında Sözleşme Düzenlenmemesi
 - Doğrudan Teminle Alımı Yapılan Bir Kısım Bakım Onarım ve Yapım İşinde Teknik Şartnameye Yer Verilmemesi ve Servis Raporlarının Eksik Düzenlenmesi
 - Satın Alınan Bazı Mal ve Malzemeler İçin Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmemesi
 - E-Arşiv Faturaların Sorgulamalarının Birim Yetkilisinin Adı, Soyadı, Unvanı, İmzası ve Resmî Mühür İle Onay Tarihini Taşıyacak Şekilde Ödeme Belgesine Bağlanmaması
 - Muayene Kabul İşlemlerinin Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması
 - Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımların EKAP'a Kaydedilmemesi
 - Tek Kaynaktan Temin Edilen Mal ve Hizmetlere İlişkin Piyasa Fiyat Araştırmasının Mevzuata Uygun Yapılmaması
- Şeklinde sıralanmaktadır.

Yukarıda tespit edilen bulgular ile ilgili olarak 12.10.2023 tarihli ve E-34671583-930-2300111890 sayılı yazımız ile Başkanlığımız personeline Tesis Edilecek İşlemler ile ilgili gerekli talimat verilmiştir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde Başkanlığımız ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

3.2 Performans Bilgileri

2023 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışına ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.


Performans Göstergeleri	Gerçekleşme Durumu			Açıklama
	Gerçekleşmedi	Kısmen Gerçekleşti	Gerçekleşti	
Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşine devam edilerek işin %60'lık kısmının tamamlanması			✓	İş programına göre işin %70'lik kısmı tamamlandı.
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m ³ Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım işinin tamamlanarak Geçici Kabulünün yapılması			✓	04.08.2023 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşinin tamamlanarak Geçici Kabulünün yapılması			✓	26.07.2023 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı işinin tamamlanarak Geçici Kabulünün yapılması			✓	24.11.2023 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi işinin ihalesine çıkılarak Geçici Kabulünün yapılması			✓	04.10.2023 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
Açık Spor Kompleksi Yapım İşinin ihalesine çıkılarak yükleniciye yer teslimi yapılması	✓			İhale iptal edildi.
KÜ 2023 Yılı Kampüs içi Otopark Yapım İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması			✓	27.07.2023 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
Bakım Onarım Birimi Tarafından Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İhalesine Çıkılması			✓	20.06.2023 ve 05.07.2023 tarihinde Kabul Tutanağı onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yapım işinin ihalesine çıkılarak yüklenici ile sözleşme imzalanması			✓	27.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, işin %7'lik kısmı tamamlanmıştır.
Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı işinin yasal izinlerinin alınarak proje ve yaklaşık maliyet hazırlık sürecine devam edilmesi			✓	Süreç planlandığı şekilde devam etmektedir.

2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşinin Kesin Kabulünün yapılması			✓	23.11.2023 tarihinde Kesin Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Çökeltme Havuzu ve İstinat Duvarları Yapım İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması			✓	03.11.2023 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Kültür Merkezi Ön Proje ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması		✓		28.12.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
KÜ 2022 Yılı Fakülte Binaların Sınıf Yapılması ve Tadilatı İşinin Kesin kabulünün yapılması			✓	12.12.2023 tarihinde Kesin Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası Bakım-Onarım İşinin Kesin kabulünün yapılması			✓	05.12.2023 tarihinde Kesin Kabulü onaylandı.
2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Bozkurt MYO Binası ve Çevre Tadilatı İşinin Kesin kabulünün yapılması		✓		Kesin Kabul aşamasında
Ahmed Yesevi Konferans Salonu Tadilatı ve Tıp Fakültesi Güvenlik Binası Yapım İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması			✓	2.11.2023 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Araç MYO Binası Tadilat İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması			✓	12.12.2023 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi 2023 Yılı Kütüphane Binası Tadilat İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması			✓	19.12.2023 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı.
Kastamonu Üniversitesi Azdavay MYO Binası Tadilat İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması		✓		Geçici Kabul aşamasında
Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB MYO Binası Tadilat İşinin ihalesine çıkılarak yıl içerisinde tamamlanması		✓		Geçici Kabul aşamasında

3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

2023 yılı yatırım programında 7 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği **158.748.000,00 ₺** olan ve yıl içinde eklenen ödeneklerle **178.950.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneklerin **141.494.103,86 ₺**'si 2023 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

PROJE ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI
Derslik ve Merkezi Birimler	50.000.000,00 ₺	79.998.000,00 ₺	77.138.907,73 ₺	96%
Kampüs Altyapısı	15.000.000,00 ₺	16.000.000,00 ₺	15.728.735,37 ₺	98%
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	750.000,00 ₺	750.000,00 ₺	0,00 ₺	0%
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.998.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0%
Muhtelif İşler	10.000.000,00 ₺	30.450.000,00 ₺	27.865.931,65 ₺	92%
Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı	50.000.000,00 ₺	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0%
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	30.000.000,00 ₺	50.000.000,00 ₺	20.835.969,11 ₺	42%
TOPLAM	158.748.000,00 ₺	179.200.000,00 ₺	141.569.543,86 ₺	79%

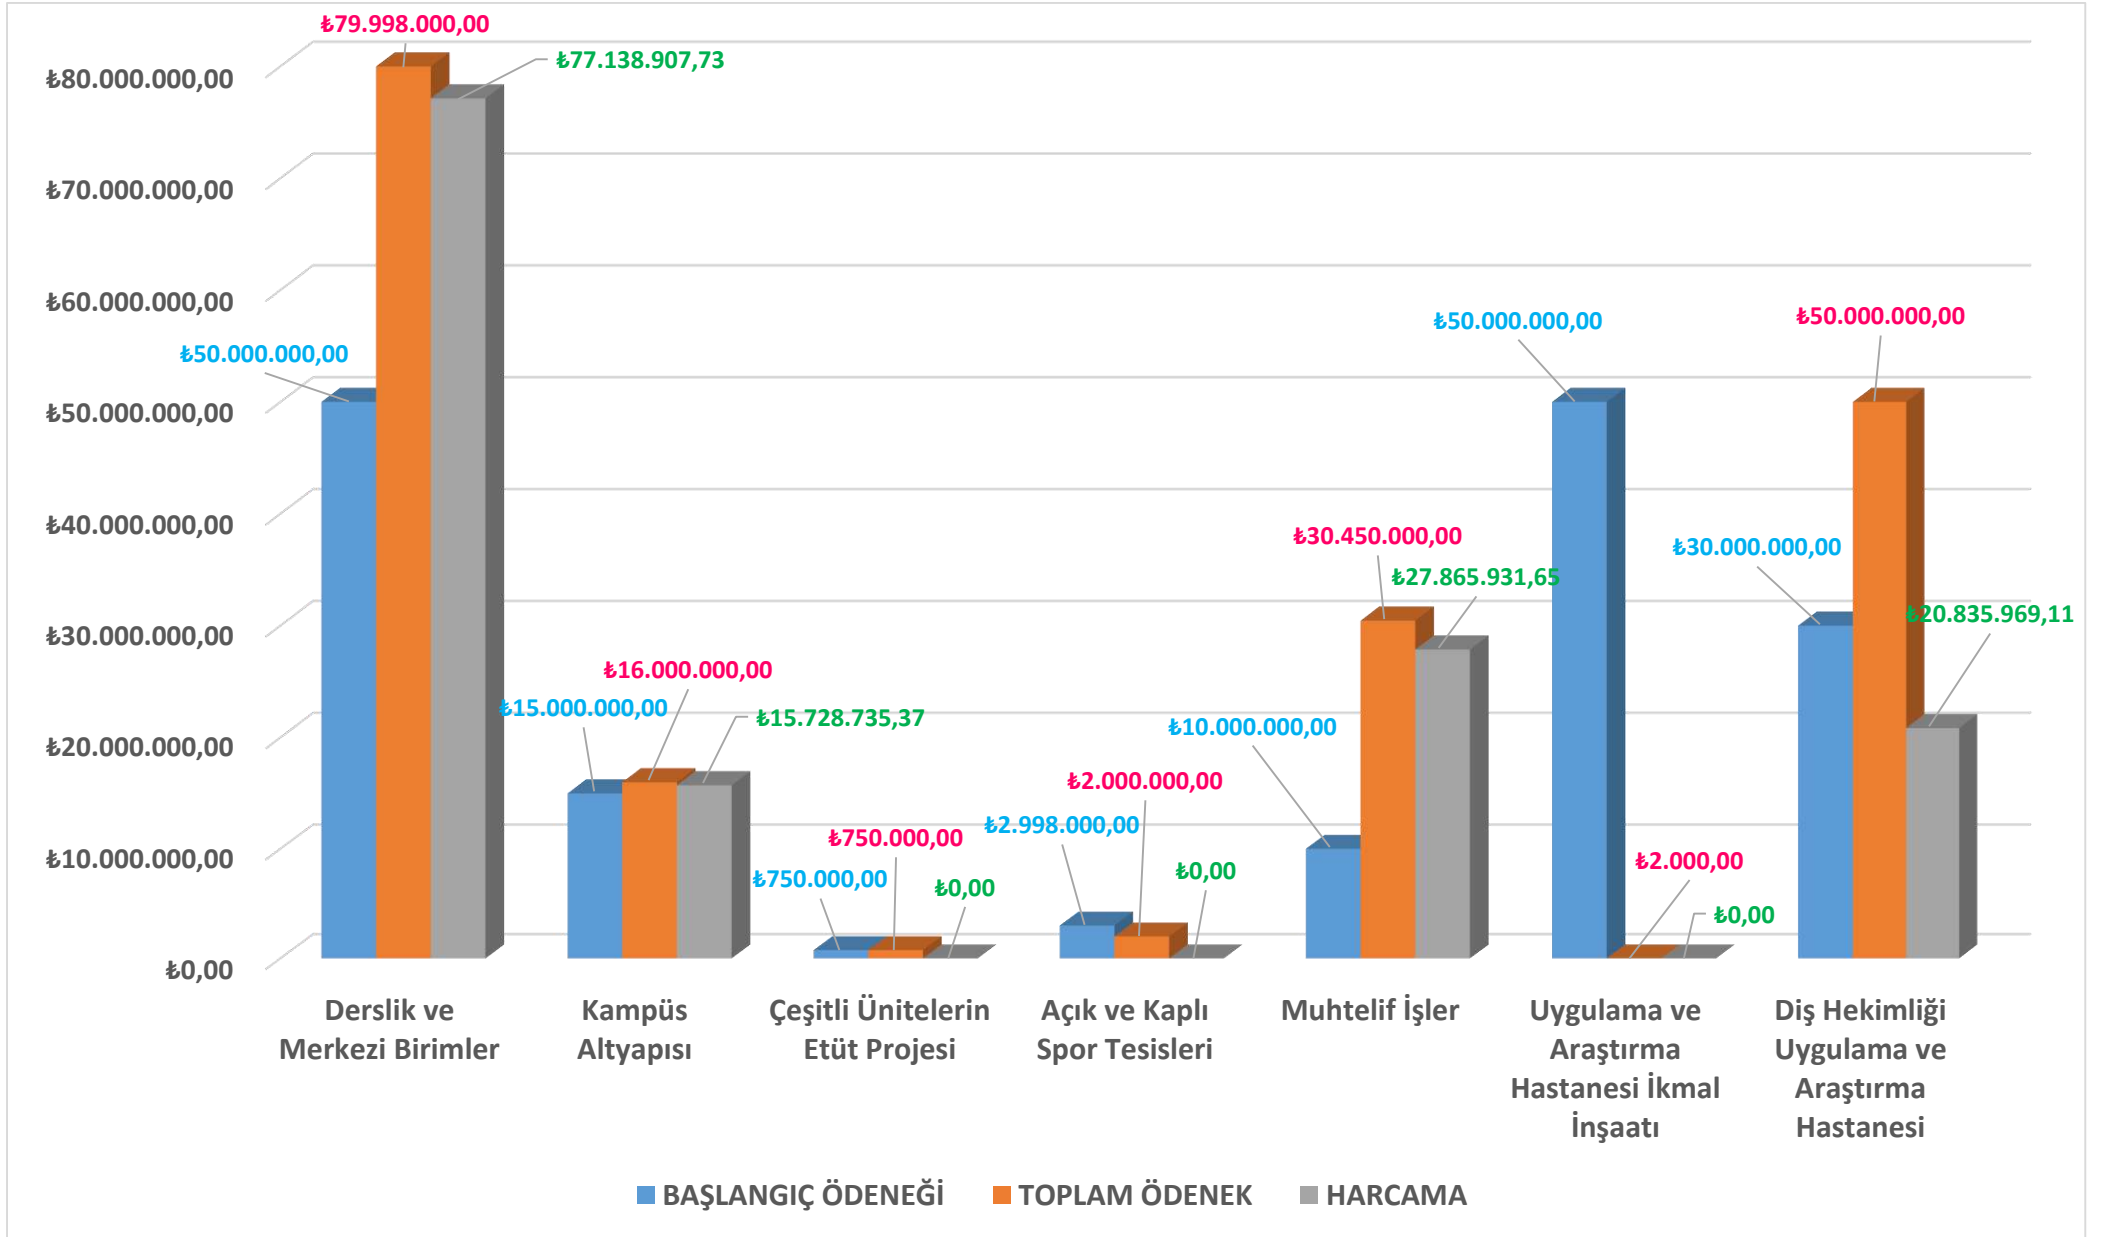

1. Proje Numarası : 2008H03-935
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama – Bitiş Yılı : 2008-2025

2023 Bütçe Kanunu ile **50.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **79.998.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **77.138.907,73 ₺**'si harcanmıştır.

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER			
YAPILAN İŞLER	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2023 YILI TOPLAM HARCAMA	İŞİN SON DURUMU
Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi	79.998.000,00 ₺	77.138.907,73 ₺	Devam ediyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Derslik ve Merkezi Birimler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/958583	Sözleşme Bedeli	87.737.000,00 ₺
İhale Tarihi	17.10.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	-1.066.443,20 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	12.452.734,89 ₺
Sözleşme Tarihi	01.11.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	77.138.907,73 ₺
Yer Teslim Tarihi	02.11.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	89.591.642,62 ₺
Süre/Ek Süre	700 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%72
İşin Son Durumu	Devam Ediyor	Yüklenici	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

















2. Proje Numarası : 2023H03-212740
 Proje Adı : Kampüs Altyapısı
 Başlama – Bitiş Yılı : 2023-2025

2023 Bütçe Kanunu ile **15.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **16.000.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **15.728.735,37 ₺**'si harcanmıştır.

KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER			
YAPILAN İŞLER	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2023 YILI TOPLAM HARCAMA	İŞİN SON DURUMU
2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşİ	16.000.000,00 ₺	251.851,12 ₺	Kesin Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m ³ Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım İşİ		6.547.242,92 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşİ		5.074.398,89 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
K.Ü. 2023 Yılı Kampüs İçi Otopark Yapım İşİ		981.840,22 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Çökeltme Havuzu ve İstinat Duvarları Yapım işİ		2.542.118,08 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu İcra Dairesi Müdürlüğü 2023/25645E Sayılı Dosyaya İcra Ödemesi		331.284,14 ₺	—

2022 YILI 1. ETAP KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	08.11.2022
İhale Kayıt No:	2022/522118	Sözleşme Bedeli	3.878.033,60 ₺
İhale Tarihi	16.06.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.802.846,10 ₺
Sözleşme Tarihi	05.07.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	251.851,12 ₺
Yer Teslim Tarihi	18.07.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.054.697,22 ₺
Süre/Ek Süre	60/8 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Kesin Kabulü yapıldı.	Yüklenici	AKFE ELEKTROMEKANİK KİMYA İNŞ. MED. GI. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ 600 m³ BETONARME SU DEPOSU İSALE VE SULAMA HATTI			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	24.07.2023
İhale Kayıt No:	2022/1300938	Sözleşme Bedeli	6.285.518,00 ₺
İhale Tarihi	07.12.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	-260.429,11 ₺
İhale Türü	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	19.12.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	6.547.242,92 ₺
Yer Teslim Tarihi	23.12.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	6.547.242,92 ₺
Süre/Ek Süre	240 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı.	Yüklenici	SÖNMEZ PARKE ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC LTD.ŞTİ





KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ İSTİNAT DUVARI YAPIM

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	26.07.2023
İhale Kayıt No:	2022/1226689	Sözleşme Bedeli	3.818.453,70 ₺
İhale Tarihi	05.12.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	373.131,90 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	04.01.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	5.074.398,89 ₺
Yer Teslim Tarihi	04.01.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	5.074.398,89 ₺
Süre/Ek Süre	150/25 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı.	Yüklenici	MMD İNŞAAT NAKLİYAT BİLİŞİM TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



K.Ü 2023 YILI KAMPÜS İÇİ OTOYARK YAPIM

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	18.05.2023
İhale Kayıt No:	2023/112756	Sözleşme Bedeli	795.211,74 ₺
İhale Tarihi	15.02.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	38.028,04 ₺
İhale Türü	Yapım-Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	06.03.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	981.840,22 ₺
Yer Teslim Tarihi	10.03.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	981.840,22 ₺
Süre/Ek Süre	45/25 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı.	Yüklenici	MUHAMMED MUSTAFA TELLİ





KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÇÖKELTME HAVUZU VE İSTİNAT DUVARLARI YAPIM İŞİ

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	27.10.2023
İhale Kayıt No:	2023/813521	Sözleşme Bedeli	1.891.377,00 ₺
İhale Tarihi	04.09.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	276.507,93 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	03.10.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.542.118,08 ₺
Yer Teslim Tarihi	03.10.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.542.118,08 ₺
Süre/Ek Süre	30 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı	Yüklenici	SÖNMEZ PARKE ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC LTD.ŞTİ



3. Proje Numarası : 2023H03-212732
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama – Bitiş Yılı : 2023-2023

2023 Bütçe Kanunu ile **750.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, 2023 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER			
YAPILAN İŞLER	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2023 YILI TOPLAM HARCAMA	İŞİN SON DURUMU
Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Kültür Merkezi Ön Proje ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ	750.000,00 ₺	0,00 ₺	Devam ediyor

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ ÖN PROJE VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2023/1400373	Sözleşme Bedeli	624.000,00 ₺
İhale Tarihi	08.12.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım – Pazarlık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	28.12.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Yer Teslim Tarihi	—	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Süre/Ek Süre	90 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%1
İşin Son Durumu	Devam ediyor	Yüklenici	ÖZGÜR YILDIZLI MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT BİLGİSAYAR KIRTASIYE TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

- 4. Proje Numarası** : 2023H05-212943
Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama – Bitiş Yılı : 2023-2025

2023 Bütçe Kanunu ile **3.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde düşülen ödeneklerle **2.000.000,00 ₺**'ye ulaşan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

5. Proje Numarası : 2023H03-212734

Proje Adı : Muhtelif İşler

Başlama - Bitiş Yılı : 2023-2023

2023 Bütçe Kanunu ile **10.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **30.450.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **27.865.931,65 ₺**'si harcanmıştır.

MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER			
YAPILAN İŞLER	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2023 YILI TOPLAM HARCAMA	İŞİN SON DURUMU
2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Tadilatı işi	30.450.000,00 ₺	6.925,01 ₺	Kesin Kabul aşamasında
2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı		2.275.863,18 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası bakım Onarım İşİ		13.854,44 ₺	Kesin Kabulü yapıldı.
KÜ 2022 Yılı Fakülte Binalarının Sınıf Yapılması ve Tadilat İşİ		106.309,45 ₺	Kesin Kabulü yapıldı.
KÜ Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşİ		9.539.494,68 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Ahmed Yesevi Konferans Salonu Tadilatı ve Tıp Fakültesi Güvenlik Binası Yapım İşİ		4.457.554,01 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Araç MYO Binası Tadilat İşİ		978.549,61	Geçici Kabulü yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi 2023 Yılı Kütüphane Binası Tadilat	30.450.000,00 ₺	1.176.207,97 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Azdavay MYO Tadilat		3.869.080,26 ₺	Geçici Kabul aşamasında
Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB MYO Binası Tadilat İşİ		1.065.679,97 ₺	Geçici Kabul aşamasında
İnşaat Malzemeleri, Ups (Kesintisiz güç kaynağı) ve İnşaat Ekipmanları		2.377.940,90 ₺	Kabulü yapıldı
Doğrudan Temin Ödemeleri		1.998.472,17 ₺	Tamamlandı

2022 YILI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI VE ÇEVRE TADİLATI İŞİ

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	19.12.2022
İhale Kayıt No:	2022/1079462	Sözleşme Bedeli	3.299.957,70 ₺
İhale Tarihi	18.10.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	213.014,09 ₺
İhale Türü	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.077.439,60 ₺
Sözleşme Tarihi	26.10.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	6.925,01 ₺
Yer Teslim Tarihi	26.10.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.084.364,61 ₺
Süre/Ek Süre	40/15 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Kesin kabul aşamasında	Yüklenici	GÜVENTÜRK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ



2022 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜS BİNALARININ ÇATI TADİLATI

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	04.10.2023
İhale Kayıt No:	2022/877070	Sözleşme Bedeli	3.186.582,00 ₺
İhale Tarihi	19.09.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.104.395,12 ₺
Sözleşme Tarihi	21.10.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.275.863,18 ₺
Yer Teslim Tarihi	24.10.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.380.258,30 ₺
Süre/Ek Süre	45 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı.	Yüklenici	ABDULVAHİT ÇUKUR



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ


Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	21.11.2022
İhale Kayıt No:	2022/863433	Sözleşme Bedeli	567.687,00 ₺
İhale Tarihi	05.09.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	69.560,92 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	643.040,88 ₺
Sözleşme Tarihi	26.09.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	13.854,44 ₺
Yer Teslim Tarihi	30.09.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	656.895,32 ₺
Süre/Ek Süre	25/5 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Kesin kabulü yapıldı.	Yüklenici	ABDULVAHİT ÇUKUR

KÜ 2022 YILI FAKÜLTE BİNALARININ SINIF YAPILMASI VE TADİLAT İŞİ

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	11.11.2022
İhale Kayıt No:	2022/608910	Sözleşme Bedeli	2.599.283,00 ₺
İhale Tarihi	06.07.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	-285.244,87 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.486.051,65 ₺
Sözleşme Tarihi	25.07.2022	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	106.309,45 ₺
Yer Teslim Tarihi	29.07.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.592.361,10 ₺
Süre/Ek Süre	90/7 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Kesin kabulü yapıldı	Yüklenici	ABDULVAHİT ÇUKUR

KÜ EMİN BAYDİL İDARİ HİZMET BİNASININ VETERİNER FAKÜLTESİ İDARİ HİZMET BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	04.09.2023
İhale Kayıt No:	2023/27748	Sözleşme Bedeli	7.362.106,88 ₺
İhale Tarihi	07.02.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	569.116,47 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	01.03.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	9.539.494,88 ₺
Yer Teslim Tarihi	06.03.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	9.539.494,88 ₺
Süre/Ek Süre	90/31 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabulü yapıldı.	Yüklenici	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.



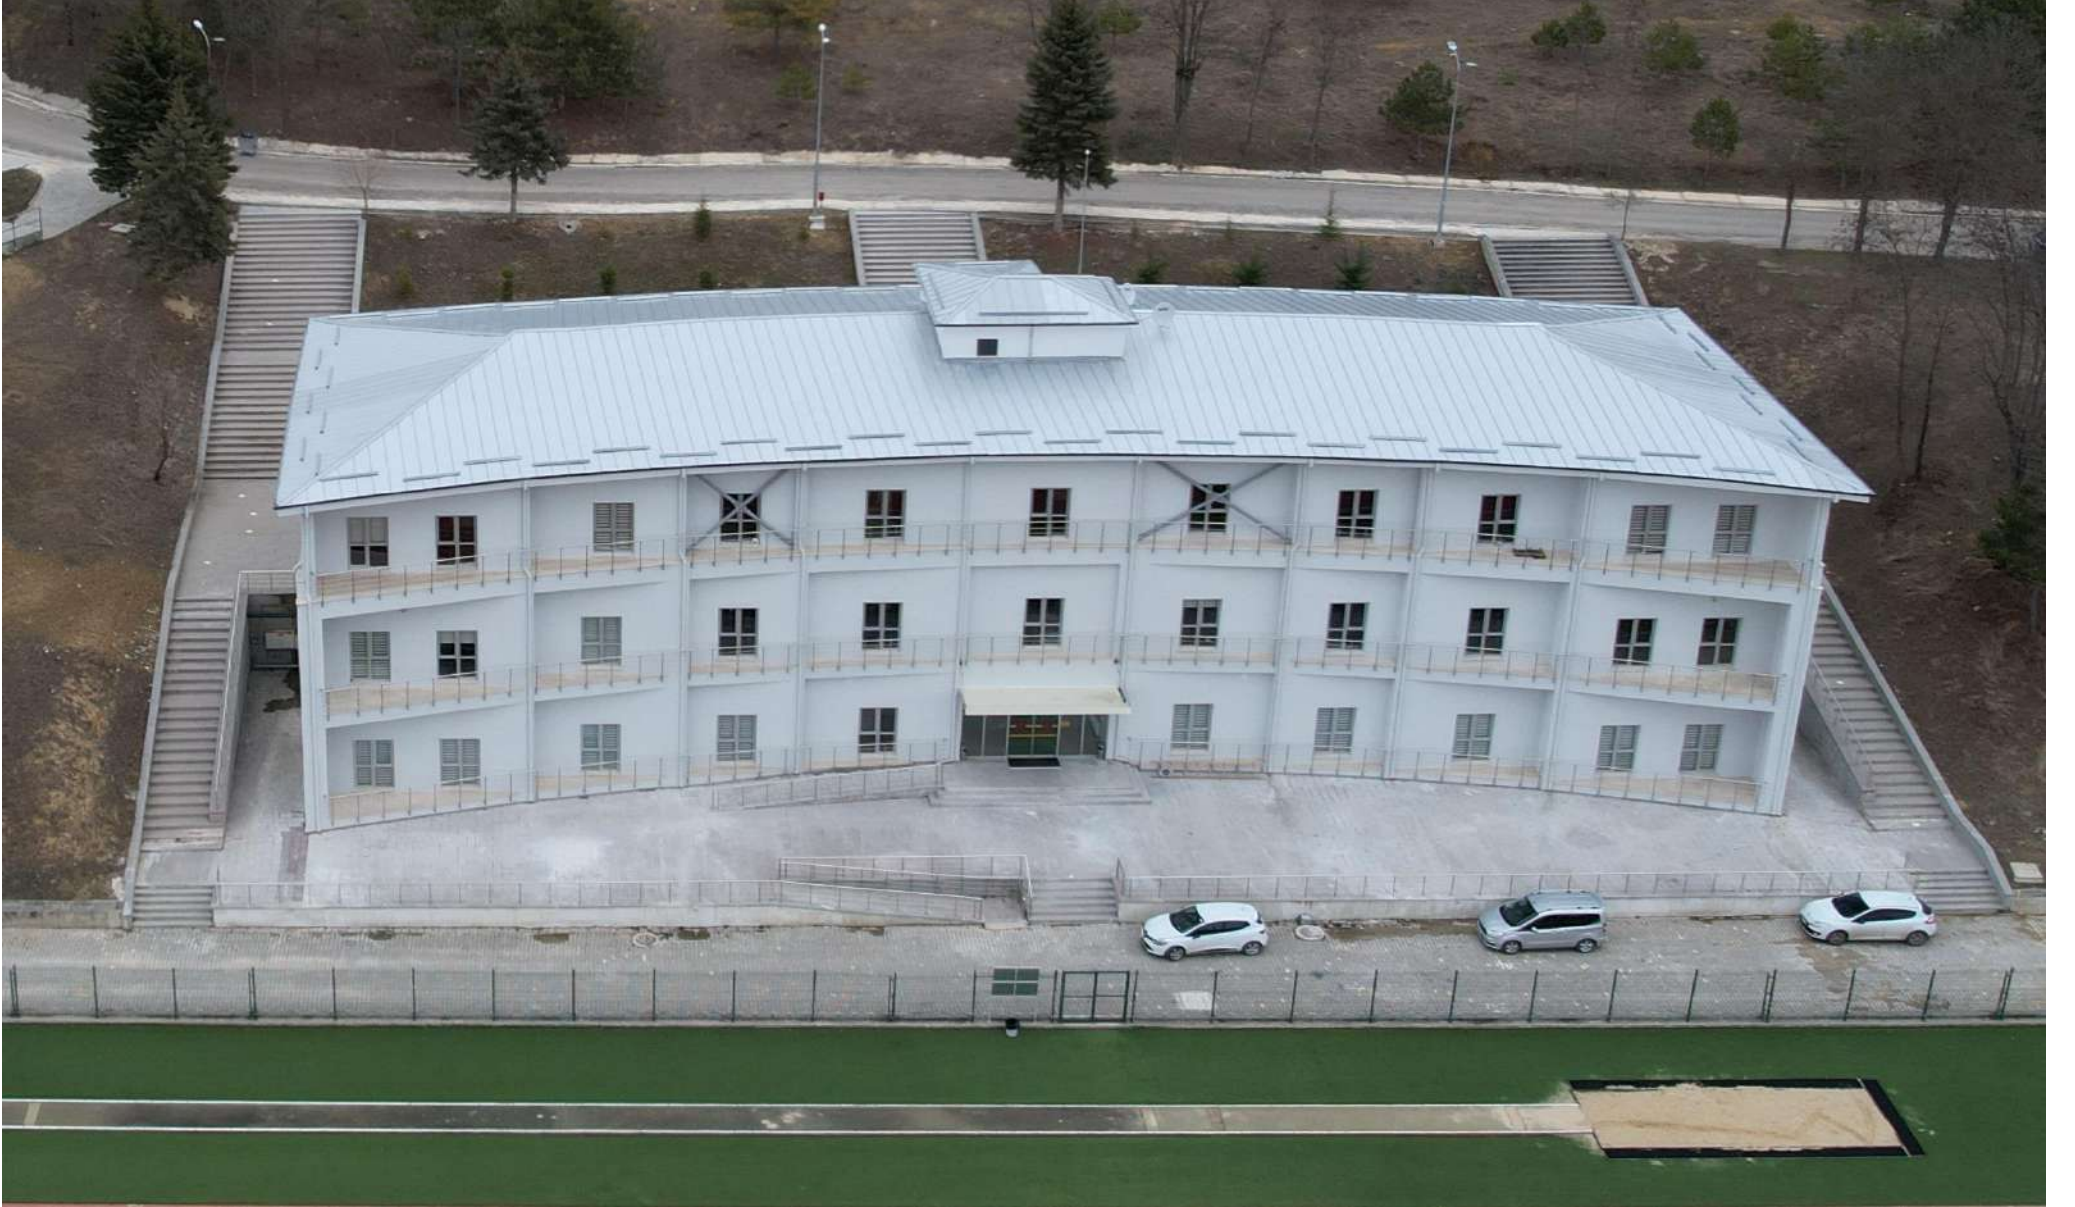






AHMED YESEVİ KONFERANS SALONU TADİLATI VE TIP FAKÜLTESİ GÜVENLİK BİNASI YAPIM İŞİ

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	15.09.2023
İhale Kayıt No:	2023/348356	Sözleşme Bedeli	3.223.492,08 ₺
İhale Tarihi	02.05.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	498.274,74 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	24.05.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.457.554,01 ₺
Yer Teslim Tarihi	29.05.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.457.554,01 ₺
Süre/Ek Süre	80/15 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabulü yapıldı.	Yüklenici	FERHAT EMİNOĞLU





KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAÇ MYO BİNASI TADİLAT İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	07.11.2023
İhale Kayıt No:	2023/819435	Sözleşme Bedeli	1.094.808,30 ₺
İhale Tarihi	21.08.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	-69.140,25 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	14.09.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	978.549,61 ₺
Yer Teslim Tarihi	14.09.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	978.549,61 ₺
Süre/Ek Süre	40 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabulü yapıldı.	Yüklenici	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI TARIMSAL KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTET ŞİRKETİ

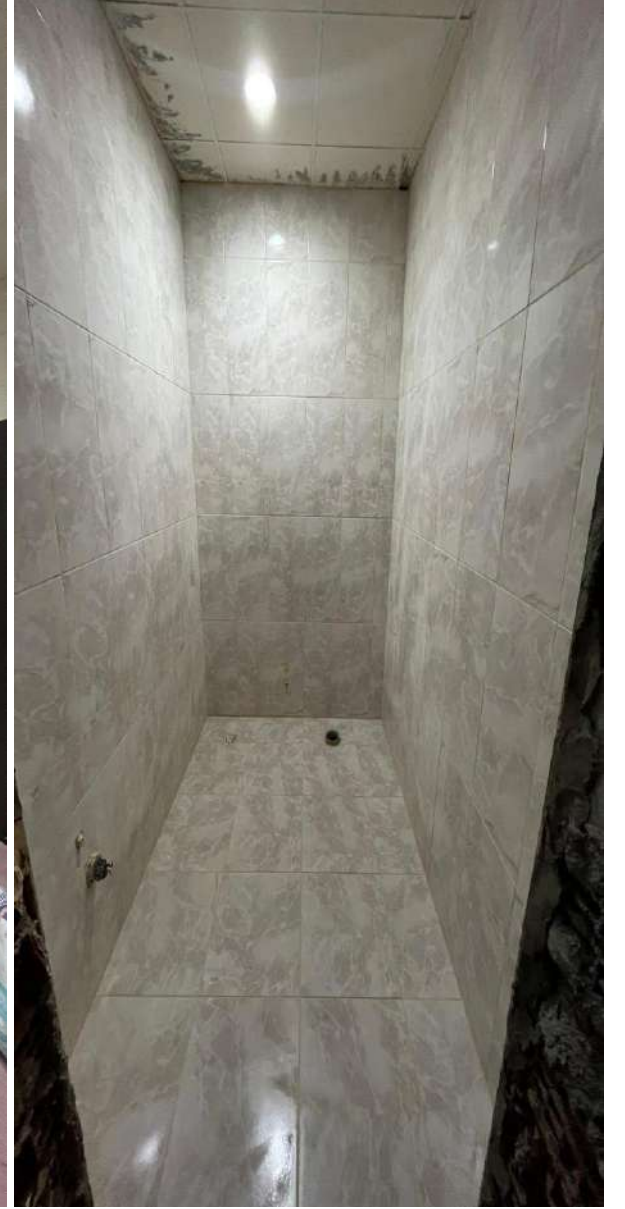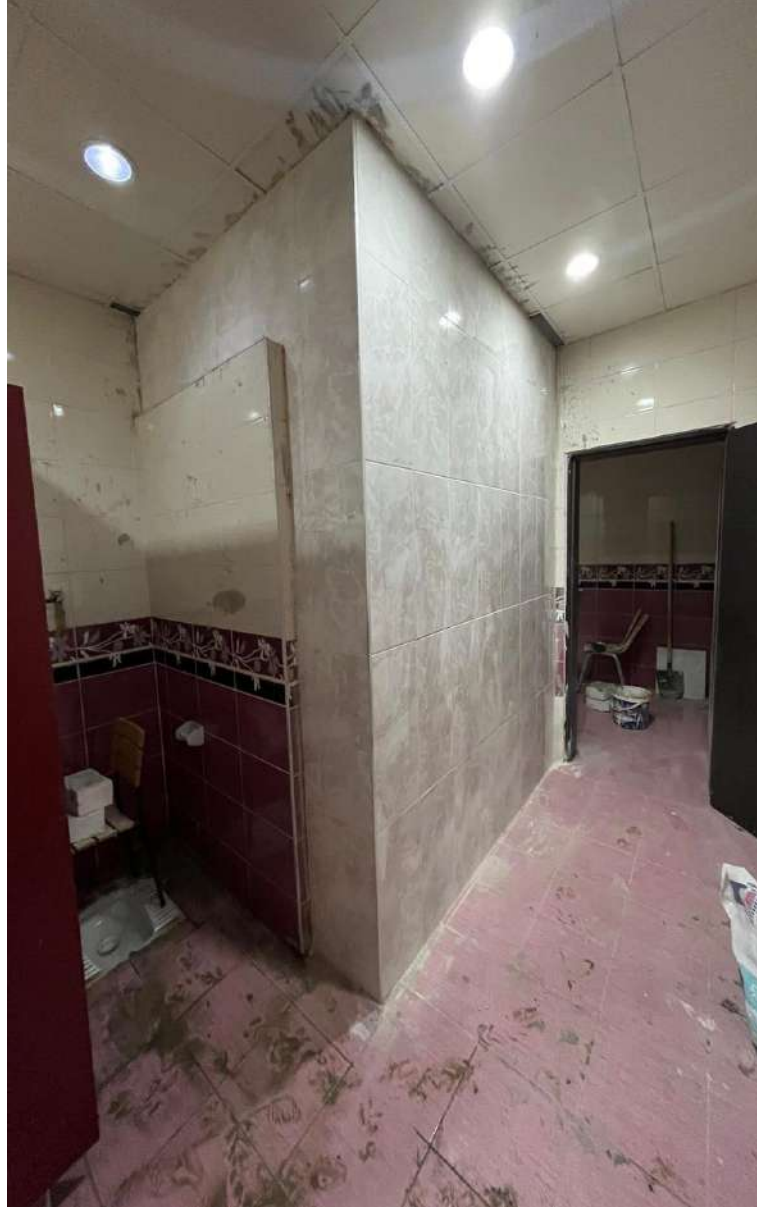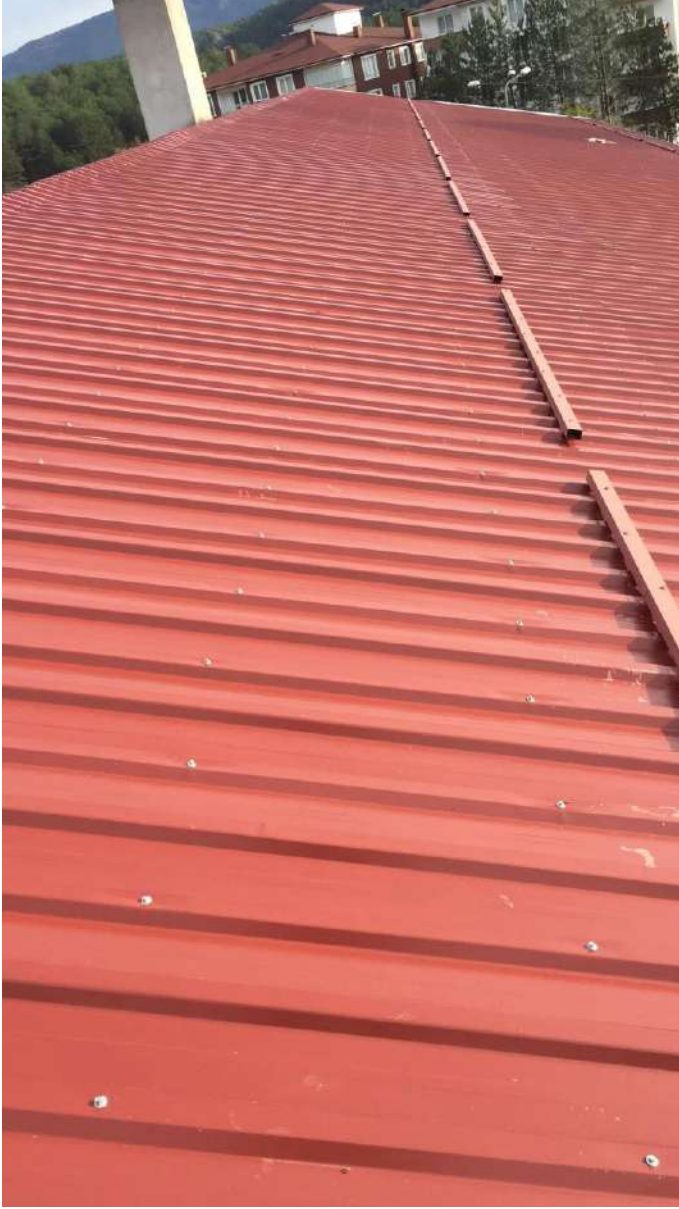

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI KÜTÜPHANE BİNASI TADİLAT

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	08.11.2023
İhale Kayıt No:	2023/821000	Sözleşme Bedeli	1.301.764,90 ₺
İhale Tarihi	21.08.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	-310.511,78 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	14.09.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.176.207,97 ₺
Yer Teslim Tarihi	15.09.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.176.207,97 ₺
Süre/Ek Süre	40/20 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabulü yapıldı.	Yüklenici	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI TARIMSAL KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTET ŞİRKETİ



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AZDAVAY MYO TADİLAT

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2023/901060	Sözleşme Bedeli	3.093.929,94 ₺
İhale Tarihi	20.09.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	354.191,26 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	09.10.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.869.080,26 ₺
Yer Teslim Tarihi	13.10.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.869.080,26 ₺
Süre/Ek Süre	45/12 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabul aşamasında	Yüklenici	FATİH YUSUF ÇALIŞKAN









KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DEVREKANİ TOBB MYO BİNASI TADİLAT

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2023/886287	Sözleşme Bedeli	1.096.254,95 ₺
İhale Tarihi	07.09.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	40.201,31 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	29.09.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.065.679,97 ₺
Yer Teslim Tarihi	03.10.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.065.679,97 ₺
Süre/Ek Süre	40 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici kabul aşamasında	Yüklenici	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI TARIMSAL KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTET ŞİRKETİ



İNŞAAT MALZEMELERİ, UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) VE İNŞAAT EKİPMANLARI			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2023/364775	Sözleşme Bedeli	1.773.879,51 ₺ / 248.220,00 ₺
İhale Tarihi	09.05.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	30.05.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	2.085.041,30 ₺ / 292.899,60 ₺
Yer Teslim Tarihi	—	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.065.679,97 ₺
Süre/Ek Süre	35 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Kabulü yapıldı.	Yüklenici	EMENER AKSA KARADENİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / İPEK HIRDAVAT DEMİR ÇELİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

- 6. Proje Numarası** : 2022I00-211035
Proje Adı : Uygulama ve Araştırma Hastanesi İkmal İnşaatı
Başlama – Bitiş Yılı : 2022-2026

2023 yılı içerisinde **50.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, bu ödeneğin **49.998.000,00 ₺**'si diğer projelere aktarılmıştır.

- 7. Proje Numarası** : 2022I00-211049
Proje Adı : Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Başlama – Bitiş Yılı : 2022-2026

2023 Bütçe Kanunu ile **30.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **50.000.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **20.835.969,11 ₺**'si harcanmıştır.

DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER			
YAPILAN İŞLER	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	2023 YILI TOPLAM HARCAMA	İŞİN SON DURUMU
Kastamonu Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Hastanesi	50.000.000,00 ₺	20.835.969,11 ₺	Devam ediyor

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yer Aldığı Yatırım Projesi	Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Hastanesi	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2023/931818	Sözleşme Bedeli	247.813.013,13 ₺
İhale Tarihi	09.10.2023	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	27.10.2023	2023 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	20.835.969,11 ₺
Yer Teslim Tarihi	03.11.2023	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	20.835.969,11 ₺
Süre/Ek Süre	700 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%7
İşin Son Durumu	Devam ediyor	Yüklenici	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.







BAKIM ONARIM EKİBİ TARAFINDAN YAPILAN İMALATLAR

İMALATI ADI	YAKLAŞIK İMALAT MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM İŞÇİLİK MALİYETİ (2023 Fiyatlarıyla)	TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ (2023 Fiyatlarıyla)
Boya İmalatı	110.000	m ²	74,75 ₺	8.222.500,00 ₺
Çimento Harçlı Sıva İmalatı	1.350	m ²	57,50 ₺	77.625,00 ₺
Saten-Alçı Sıva İmalatı	1.140	m ²	23,00 ₺	26.220,00 ₺
Kalekim imalatı	500	m ²	37,50 ₺	18.750,00 ₺
Seramik İmalatı	400	m ²	69,00 ₺	27.600,00 ₺
Andezit Kaplama	600	m ²	230,00 ₺	138.000,00 ₺
Parke Döşeme	1.100	m ²	69,00 ₺	75.900,00 ₺
Bordür İmalatı	700	m	28,75 ₺	20.125,00 ₺
Korge İmalatı	400	m	28,75 ₺	11.500,00 ₺
İdari Ve Akademik Birimlerden Gelen Arıza Talepleri (Karşılanan)	458	Adet	—	—
Bu Tabloda ihale ve yüklenici karı yer almayıp sadece işçilik maliyetleri hesaplanmıştır.			TOPLAM	8.618.220,00 ₺


Yukarıda yapılan çalışmalar dikkate alındığında bu işin yüklenici maliyeti ile yaptırılması halinde ödenecek olan ihale, işçilik, müteahhitlik karı vb. maliyetler ödenmeyerek kamu yararı sağlandığı aşikardır.









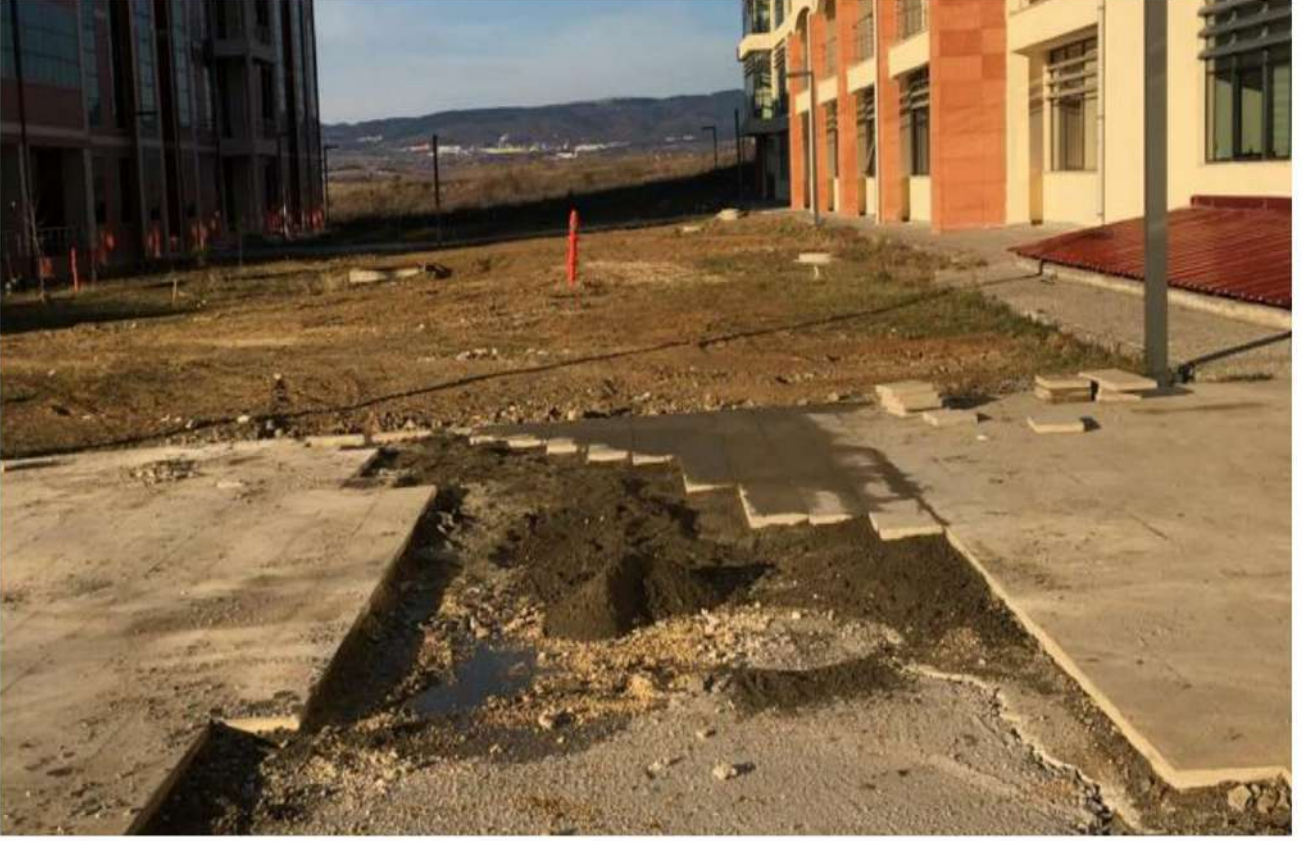



ENERJİ VERİMLİĞİ KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız tarafından 2023 yılında yapılan faaliyetler aşağıda listelenmiştir.

- ✓ Birimlere Bina Enerji Sorumluları görevlendirilmiştir.
- ✓ Periyodik olarak Bina Enerji Verimliliği Kontrol Listeleri tanzim edildi.
- ✓ Personele Enerji Verimliliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
- ✓ Emin Baydil İdari Hizmet Binası, Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Binası teraslarına çatı kaplaması yapıldı. Araç ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu Azdavay Hizmet Binası çatı tadilatları yapıldı. Ayrıca Ahmed Yesevi Konferans Salonu ile Kastamonu Meslek Yüksekokulu Azdavay Hizmet Binası mantolama çalışmaları yapıldı.
- ✓ Merkezi Kütüphane Binası cam alanlar azaltılmıştır.
- ✓ Mevcut binalarda led aydınlatma dönüşümlerine devam edildi.
- ✓ Yeni binalarda led ve otomasyonlu aydınlatma sistemlerinin kullanımı teşvik edildi.
- ✓ Kompanizasyon kontrolleri yapılarak kayıp enerji tüketimleri minimize edilmeye çalışıldı.
- ✓ Kastamonu Meslek Yüksekokulu Azdavay Hizmet Binası kazan dairesinde boru yalıtımları yapıldı. Ayrıca stoker takılarak yakıt tasarrufu yapılması amaçlandı.



ERİŞEBİLİRLİK KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin engelli wc'leri standartlara uygun ölçülerde yeniden dizayn edildi.
- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin engelli otoparkları standartlarına uygun hale getirilerek yatayda engelli logosu çizilerek boyandı ve dikey levhaları yerleştirildi.
- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin kat planları düzenlenerek Braille alfabeli kat planları asansör içlerine yerleştirildi.
- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin Braille alfabeli olarak haritalı yerleşkeleri düzenlendi ve yerleştirildi.
- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin hissedilebilir yüzeyleri (uyarıcı/kılavuz) yapımına devam edilmektedir.
- ✓ Merkez Yemekhane ve Ahmet Yesevi Konferans Salonunun cam bandı uygulaması tamamlandı.
- ✓ Merkez Kampüsteki binalarımızın ve Tıp Fakültesi'nin Braille alfabeli engelli wc yönlendirme levhaları takıldı.




BİNA ADI	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KOİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ		
ZEMİN KAT	ENERJİ ODASI	SİĞİRCI	
	KAZAN DAİRESİ	KANTİN	
	SU DEPOSU	DEPO	
	ZAYIF AKIM VE SİSTEM ODASI	GÜVENLİK GÖREVLİSİ ODASI	
1. KAT	ATÖLYE	İŞKUR ODASI	
	LABORATUVARLAR	KAT FANOSU ODASI	
	KONFERANS SALONU	ENGELLİ - KADIN - ERKEK WC	
	AKADEMİK PERSONEL ODASI	LABORATUVARLAR	
	FAKÜLTE SEKRETERİ ODASI	ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ODASI	
	İDARİ PERSONEL ODASI	ATÖLYE	
	DERSLİKLER	KAT FANOSU ODASI	
	BİLGİSAYAR LABORATUVARI	ENGELLİ - KADIN - ERKEK WC	
	2. KAT	AKADEMİK PERSONEL ODASI	ÇAY ODASI
		İDARİ PERSONEL ODASI	PAZAR
DEKAN ODASI		TOPLANTI SALONU	
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ ODASI		SEMINER SALONU	
DEKAN YARDIMCISI ODASI		ATÖLYE	
MÜDÜR YARDIMCISI ODASI		MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI ODASI	
FAKÜLTE SEKRETERİ ODASI		KADIN - ERKEK MESCİT	
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ODASI		KAT FANOSU ODASI	
DERSLİK		ENGELLİ - KADIN - ERKEK WC	
DERGİ ODASI		DERSLİKLER	
3. KAT	DEPO		
	AKADEMİK PERSONEL ODASI	DERSLİKLER	





DUMANSIZ HAVA SAHASI BİLGİLERİ (Kuzeykent Kampüsü)

BİNA ADI	TOPLAM (m ²)	BİNA ADI	TOPLAM (m ²)
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	70,00	ORMAN FAKÜLTESİ	61,38
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	70,00	ORMAN FAKÜLTESİ	48,50
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	100,00	ORMAN FAKÜLTESİ	14,04
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	58,00	ORMAN FAKÜLTESİ	200,88
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	65,55	KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	90,00
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	100,00	KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	120,00
MERKEZ YEMEKHANE	70,00	KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	51,66
MERKEZ YEMEKHANE	74,90	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	117,00
TURİZM FAKÜLTESİ	63,00	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	42,64
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	240,00	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	30,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	330,00	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	74,52
AY YILDIZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ	120,00	MERKEZ KÜTÜPHANESİ	175,50
AY YILDIZ SPOR VE YAŞAM MERKEZİ	155,00	MERKEZ KÜTÜPHANESİ	247,50
İLETİŞİM FAKÜLTESİ	112,75	MEVLÜT BEYRİBEY KONUKEVİ	93,60
İLETİŞİM FAKÜLTESİ	168,75	REKTÖRLÜK BİNASI	225,00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ	64,00	TEKNOKENT	128,34
İLETİŞİM FAKÜLTESİ	104,16	TIP FAKÜLTESİ	82,00
MERKEZİ ARAŞ. LAB. UYG. VE ARAŞ. MER.	82,65	TIP FAKÜLTESİ	63,84
ORMAN FAKÜLTESİ	75,00	SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	110,00
ORMAN FAKÜLTESİ	82,08	TOPLAM (m ²)	4.182,24

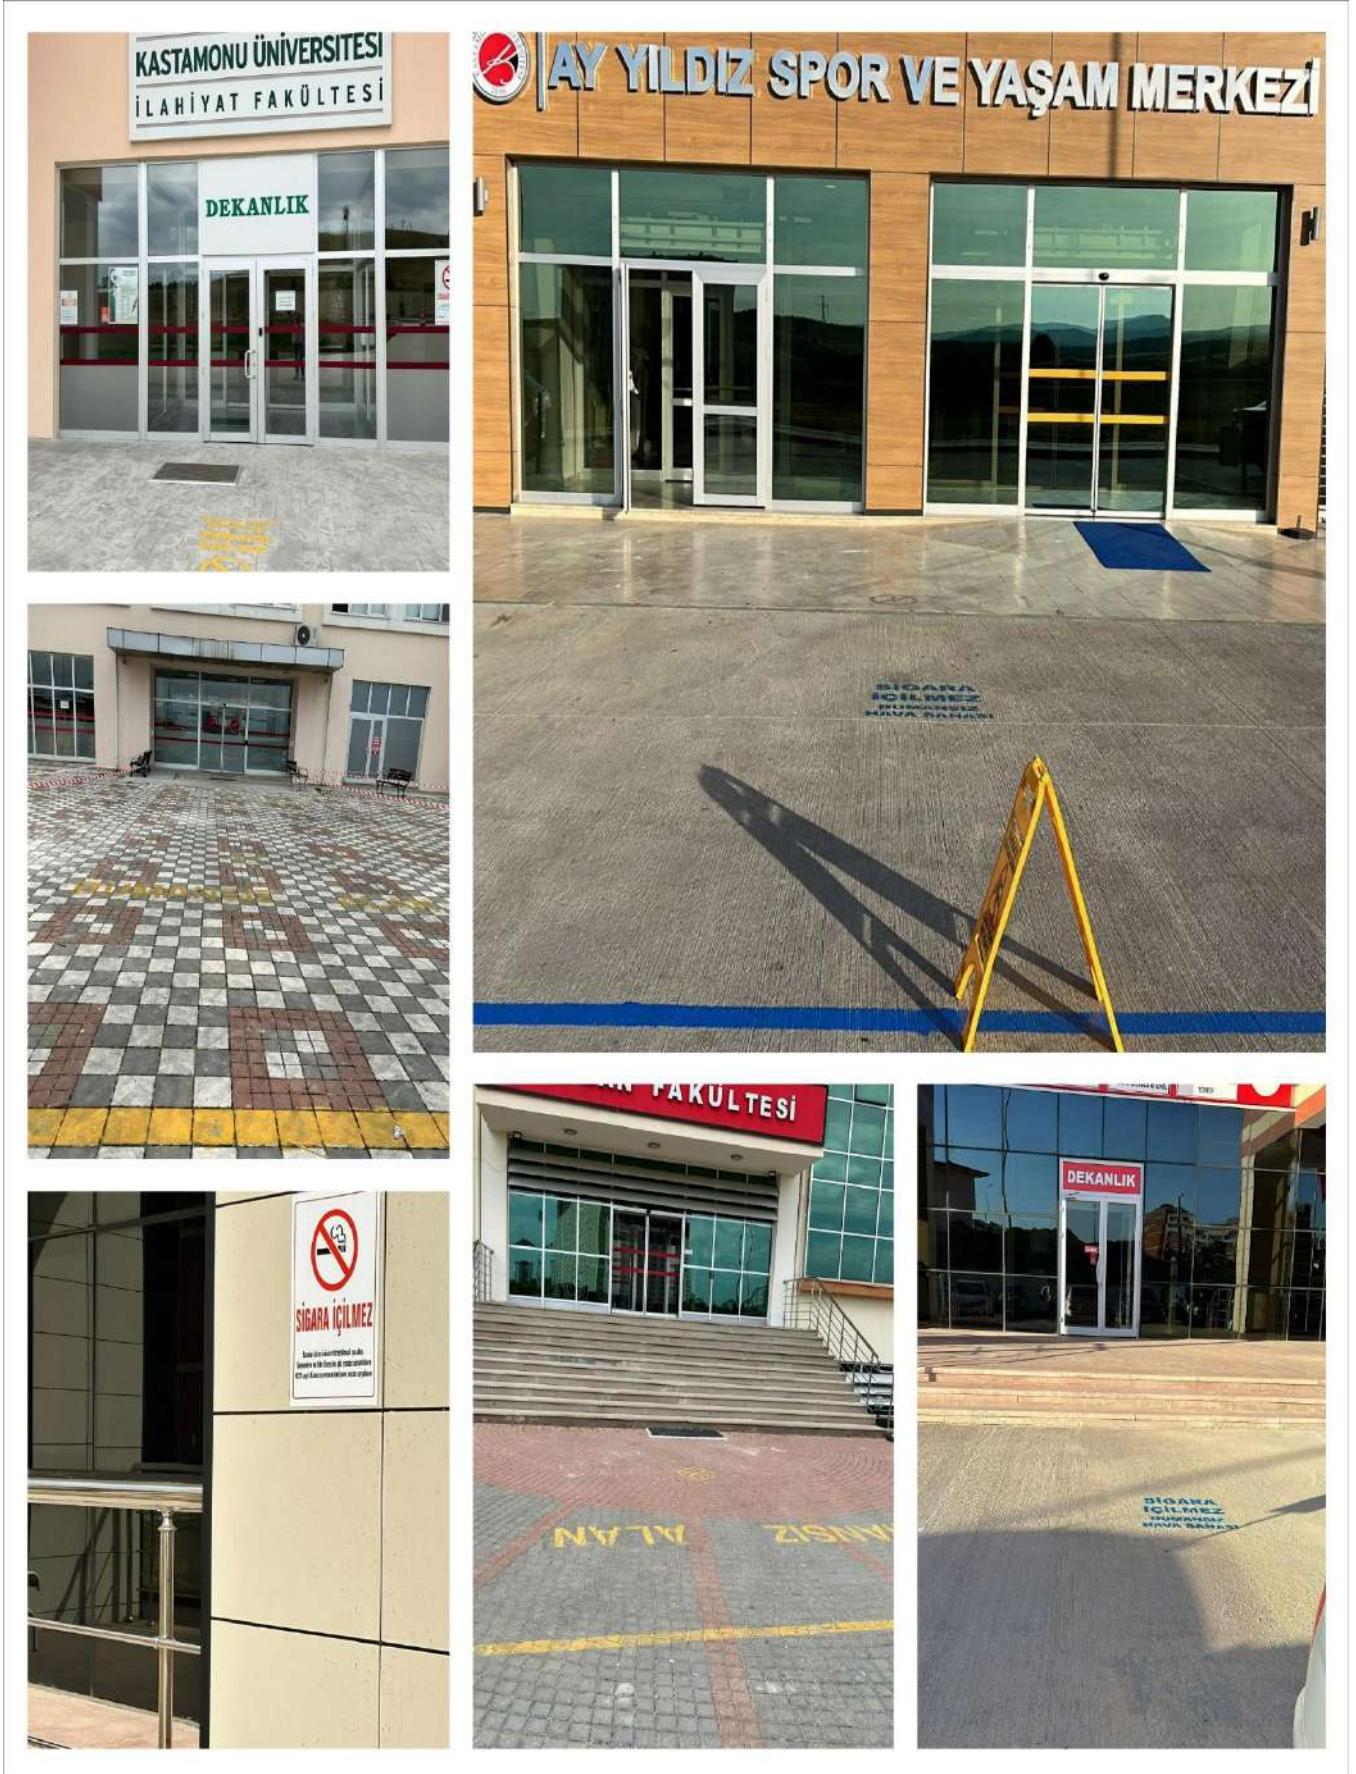

2023 YILINDA YAPILAN İHALELERİMİZ

Sıra Numarası	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	Yatırım Proje Numarası	İhale Tarihi	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Bedeli	Yüklenici
1	2023/1400373	Kastamonu Üniversitesi Eğitim ve Kültür Merkezi Ön Proje ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	2023H03-212732	8.12.2023	28.12.2023	624.000,00 ₺	ÖZGÜR YILDIZLI MİMA.MÜH.MÜŞ.İN.BİL.KIR.TA.Tİ.SA.LT.Ş
2	2023/931818	Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2022I00-211049	9.10.2023	27.10.2023	247.813.013,13 ₺	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
3	2023/901060	Kastamonu Üniversitesi Azdavay MYO Tadilat	2023H03-212734	20.09.2023	9.10.2023	3.093.929,94 ₺	FATİH YUSUF ÇALIŞKAN
4	2023/813521	Kastamonu Üniversitesi Çökeltme Havuzu ve İstinat Duvarları	2023H03-212740	4.09.2023	3.10.2023	1.891.377,00 ₺	SÖNMEZ PARKE ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ
5	2023/886287	Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB MYO Binası Tadilat	2023H03-212734	7.09.2023	29.09.2023	1.096.254,95 ₺	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI, TARIMSAL, KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
6	2023/821000	Kastamonu Üniversitesi 2023 Yılı Kütüphane Binası Tadilat	2023H03-212734	21.08.2023	14.09.2023	1.301.764,90 ₺	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI, TARIMSAL, KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
7	2023/819435	Kastamonu Üniversitesi Araç MYO Binası Tadilat İşi	2023H03-212734	21.08.2023	14.09.2023	1.094.808,30 ₺	TEKNİK ZİRAAT M.DOĞANOĞULLARI, TARIMSAL, KİMYASAL PAZARLAMA TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ

8	2023/364775	İnşaat Malzemeleri, Ups (kesintisiz güç kaynağı) ve İnşaat Ekipmanları	2023H03-212734	9.05.2023	30.05.2023	248.220,00 ₺	EMENER AKSA KARADENİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
						1.773.879,51 ₺	İPEK HIRDAVAT DEMİR ÇELİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
9	2023/348356	Ahmed Yesevi Konferans Salonu Tadilatı ve Tıp Fakültesi Güvenlik Binası	2023H03-212734	2.05.2023	24.05.2023	3.223.492,08 ₺	FERHAT EMİNOĞLU
10	2023/112756	KÜ 2023 Yılı Kampüs İçi Otopark Yapımı İşİ	2023H03-212740	15.02.2023	6.03.2023	795.211,74 ₺	MUHAMMED MUSTAFA TELLİ
11	2023/27748	KÜ Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşİ	2023H03-212734	7.02.2023	1.03.2023	7.362.106,88 ₺	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

2023 YILINDA İPTAL EDİLEN İHALELERİMİZ

Sıra Numarası	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	İhale Tarihi	İptal Tarihi	İptal Gerekçesi
1	2023/111528	KÜ Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası ile Basketbol Sahası Yapım İşİ	23/02/2023	15/03/2023	Binanın depreme dayanıksız olmasından dolayı
2	2023/299649	Kastamonu Üniversitesi 2023 Yılı Basketbol Sahası Yapım İşİ	07/04/2023	14/04/2023	Yapım yerinin uygun olmaması
3	2023/619598	Araç MYO ile Devrekani MYO Binalarının Bakım Onarım	05/07/2023	05/07/2023	İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkması Nedeniyle
4	2023/805164	Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	05/09/2023	05/09/2023	Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğİn/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
5	2023/819392	Kastamonu Üniversitesi Devrekani MYO Binası Tadilat	21/08/2023	21/08/2023	Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğİn/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle

İhale Türü	İhale Usulleri												Doğrudan Temin	
	Açık İhale			Belli İstekliler Arasında İhale			Pazarlık Usulü			Genel Toplam			4734/22-d	
	4734/19			4734/20			4734/21							
(Bütçe Kodu)	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı	Alım Sayısı	İhalelerin Tutarı
Mal Alımı (3.2 - 3.7 - 6.1)	1	—	2.022.099,51 ₺	—	—	0,00 ₺	—	—	0,00 ₺	1	0	2.022.099,51 ₺	17	1.018.738,63 ₺
Hizmet Alımı (3.5)	—	—	0,00 ₺	—	—	0,00 ₺	1	—	624.000,00 ₺	1	0	624.000,00 ₺	5	139.042,50 ₺
Yapım İşi (3.8 - 6.5 - 6.7)	9	5	267.671.958,92 ₺	—	—	0,00 ₺	—	—	0,00 ₺	9	5	267.671.958,92 ₺	7	806.852,00 ₺
TOPLAM	10	5	269.694.058,43 ₺	0	0	0,00 ₺	1	0	624.000,00 ₺	11	5	270.318.058,43 ₺	29	1.964.633,13 ₺

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1 Üstünlükler

- ✓ Takım çalışması yapılarak işlerin hızla bir şekilde sonuçlandırılması,
- ✓ Özveriyle çalışan personel topluluğuna sahip olunması,
- ✓ Fiziki mekan ve çalışma ekipmanlarına sahip olmak,
- ✓ Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Üniversitenin Stratejik Planı ve Kalite Politikasına uygun olarak çalışmaların yürütülmesine özen gösterilmesi,
- ✓ Birimimiz ile Üniversitenin diğer birimleri arasında güçlü bir iletişim bağının olması,
- ✓ İlimizde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimin güçlü olması ve sağlıklı bilgi alış verişinin yapılabilmesi,

4.2 Zayıflıklar

- Ödenek yetersizliği nedeniyle personelin inceleme, araştırma, teknik gezi ve fuarlara katılamaması,
- Ödenek yetersizliği nedeniyle bakım onarım taleplerinin karşılanamaması,
- Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin olmaması,
- Konusunda uzman donanımlı ve tecrübe sahibi personel bulmada yaşanan zorluklar,
- Personel sayısının yetersizliği,
- Uzun vade planlamanın yapılamaması ve projelendirme aşamasında acele edilmesi sebebiyle hata oranının artması,

4.3 Değerlendirme

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin bütçenin önemli bir kısmını oluşturması mali evraklara dayalı hesap verme yükümlülüğünün diğer birimlere göre daha fazla olmasına neden olmaktadır. Başkanlığımız birim personelinin hata yapma lüksünün olmadığı birimlerin başında gelmektedir. Buda personel üzerinde aşırı baskı ve stres ile gergin bir çalışma ortamına sebebiyet vermektedir.

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımız faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ödeneklerin artırılması gerekmektedir. Ayrıca personelin meslekleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebilmeleri amacıyla teknik gezi, fuar vb. etkinliklere katılımlarının sağlanması, personelin moral ve motivasyonunu artırıcı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve performansa dayalı ödüllendirme sisteminin de uygulanması önem arz etmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Kastamonu-Ocak 2024)

Esat ÇELİK
Daire Başkanı
